

Distr.: General
19 October 2017
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والسبعون

البند ١٣٧ من جدول الأعمال المؤقت*

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩

مشروع التعديل التقويمي لمباني مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك لجعلها مستوفية لمعايير مقاومة الزلازل واستبدال التجهيزات المنتهية الصلاحية فيها

تقرير الأمين العام


تصويب

١ - الشكل ٢

يستعاض عن الشكل ٢ بالشكل أدناه.

الشكل ٢

الجدول الزمني للمشروع المقترح في ١ تموز/يوليه ٢٠١٧

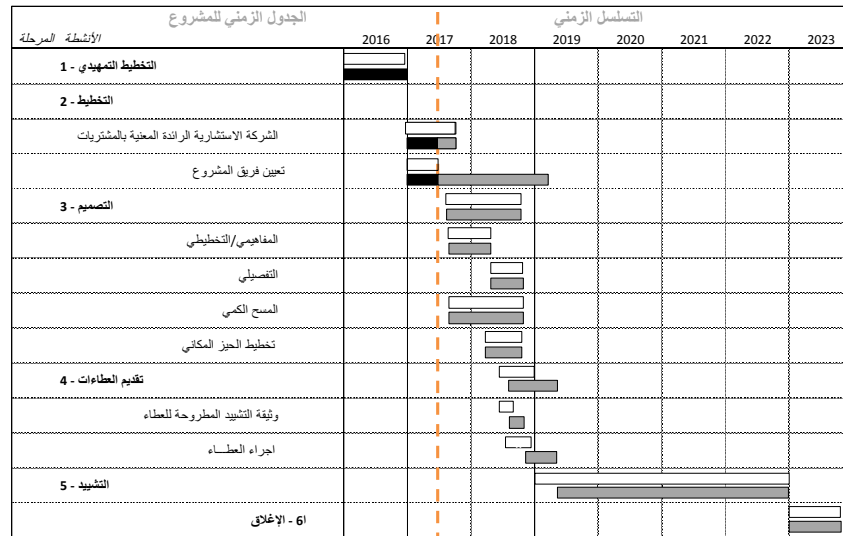

1 تموز/يوليه 2017

الجدول الزمني الأصلي للمشروع وفقاً للتقرير السابق للأمين العام (A/71/333)
الجدول الزمني الفعلي للمشروع حتى تموز/يوليه 2017
الجدول الزمني الحالي/المزمع لما بعد تموز/يوليه 2017



٢ - المرفق الثاني

يستعاض عن الجدول المدرج في الوثيقة الأصلية بالجدول أدناه.

المرحلة ٢	٣	٤	٤-٢	٥	٥	٥	٥	٥	٦	السنة ٢٠١٧ ^(١)	٢٠١٧ ^(ب)	٢٠١٧ ^(ج)	٢٠١٧ ^(د)	٢٠١٧ ^(هـ)	٢٠١٧ ^(و)	المجموع
١ - التكاليف التجارية				٢,١٣٩	٦,١٥٥	٤,٩٨٨	٨,٦٠٧	٢,٩٢٦	٢٤,٨١٦							
٢ - أتعاب الخبراء الاستشاريين	٠,٣٢٥	٠,٠٥٩	٠,٢٢٢	٠,٧٣١	٠,٣٩٢	٠,٣٠١	٠,٥٨٢	٠,١٤٢	٢,٣٧٠							
١-٢ التصميم المقاوم للزلازل	٠,١٠٠	٠,٠١٨	٠,٠٩٨						٠,٠٩٨							
٢-٢ الشركة المستقلة لإدارة المخاطر ^(د)				٠,٠٥١	٠,٠٥١	٠,٠٣٩	٠,٠٧٥	٠,٠١٨	٠,٢٣٣							
٣-٢ الشركة الاستشارية الرائدة ^(هـ)				٠,٦٥٦	٠,٣٤١	٠,٢٦٣	٠,٥٠٧	٠,١٢٣	١,٨٩٠							
٤-٢ الاستشاريون المعنيون بتسهيلات وصول ذوي الإعاقة	٠,٠٤١	٠,٠٤١							٠,٠٤١							
٥-٢ الخدمات المتعلقة بضمان جودة المشروع		٠,٠٨٣	٠,٠٢٥						٠,١٠٨							
٣- تصاعد التكاليف ^(و)	٠,٠١٣			٠,٢٣٩	٠,٨١٧	٠,٨٩٩	١,٩٩١	٠,٨١٤	٤,٧٦٠							
٤ - احتياطي الطوارئ	٠,٠٣٤			٠,٣٣٣	٠,٧٣٦	٠,٦١٩	١,١١٨	٠,٣٨٨	٣,١٩٥							
٥ - إدارة المشروع	٠,٥٠٦	٠,٢١٧	٠,٥٢٧	٠,٦٧٥	٠,٩٠١	٠,٩٥١	٠,٨٤٨	٠,٧٤٥	٤,٨٧٩	٠,٢٣٢						
المجموع	٠,٨٧٧	٠,٢٧٦	٠,٧٤٩	٤,١١٧	٨,٧٩٦	٧,٧٢٤	١٣,٢١٥	٥,١٨٧	٤٠,٠١٩	٠,٢٣٢						

(أ) تكاليف أقرتها الجمعية العامة في الفرع الرابع من القرار ٢٧٢/٧١.

(ب) استناداً إلى الاستعراض الحالي والالتزام في ١ تموز/يوليه ٢٠١٧.

(ج) تكاليف متوقعة.

(د) التكاليف المتوقعة المتعلقة بخدمات الشركة المستقلة لإدارة المخاطر التي ستستعين بها وحدة إدارة الممتلكات الخارجية التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزية، ويتم تقاسمها بنسبة ٥٠ في المائة مع مشروع قاعة أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

(هـ) ميزانية الشركة الاستشارية الرائدة هي حاصل جمع عنصري التصميم وإدارة البناء. وقد أدرجت في الميزانية بنفس المستوى المحدد في التقرير السابق (A/71/333). وفي ١ تموز/يوليه ٢٠١٧، وكان موضوع شراء خدمات الشركة الاستشارية الرائدة لا يزال لدى شعبة المشتريات التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزية ولجنة العقود في المقر.

(و) يحسب تصاعد التكاليف كنسبة مركبة قدرها ٤ في المائة سنوياً.
