



Assemblée générale

Distr. générale
19 octobre 2017
Français
Original : anglais

Soixante-douzième session

Point 137 de l'ordre du jour provisoire*

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2018-2019

Projet de mise aux normes parasismiques et de remplacement des équipements en fin de vie au siège de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, à Bangkok

Rapport du Secrétaire général


Rectificatif

1. Figure 2

Remplacer la figure 2 par la figure ci-après.

Figure 2

Proposition de calendrier du projet (1^{er} juillet 2017)

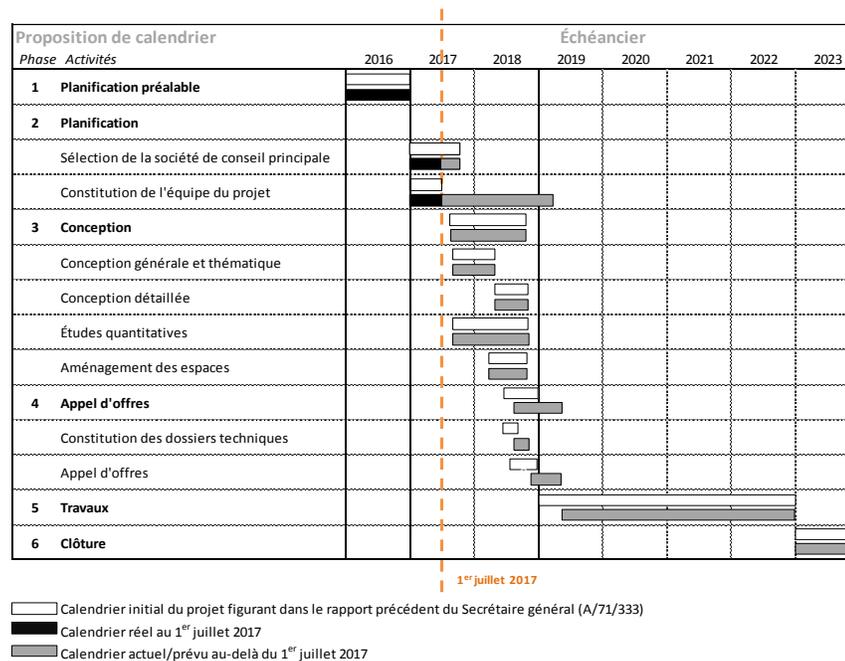

2. Annexe II

Remplacer le tableau existant par le tableau ci-après.

Plan des dépenses

(En millions de dollars des États-Unis)

	Phase			2-4	5	5	5	5	6	Total	
	Année	2 2017 ^a	3 2017 ^b	4 2017 ^c	2018 ^c	2019 ^c	2020 ^c	2021 ^c	2022 ^c		2023 ^c
1 Coûts commerciaux					2,139	6,155	4,988	8,607	2,926		24,816
2 Honoraires de consultants		0,325	0,059	0,222	0,731	0,392	0,301	0,582	0,142		2,370
2.1 Conception parasismique		0,100	0,018	0,098							0,098
2.2 Cabinet indépendant de gestion des risques ^d					0,051	0,051	0,039	0,075	0,018		0,233
2.3 Société de conseil principale ^e					0,656	0,341	0,263	0,507	0,123		1,890
2.4 Consultants en accessibilité			0,041	0,041							0,041
2.5 Système d'assurance qualité du projet				0,083	0,025						0,108
3 Hausse des coûts ^f		0,013			0,239	0,817	0,899	1,991	0,814		4,760
4 Provision pour imprévus		0,034			0,333	0,736	0,619	1,118	0,388		3,195
5 Gestion de projets		0,506	0,217	0,527	0,675	0,901	0,951	0,848	0,745	0,232	4,879
Total		0,877	0,276	0,749	4,117	8,796	7,724	13,215	5,187	0,232	40,019

^a Dépenses approuvées par l'Assemblée générale à la section IV de sa résolution 71/272.^b Dépenses calculées sur la base de l'examen en cours et des engagements au 1^{er} juillet 2017.^c Prévision.^d Dépenses prévues pour le cabinet indépendant de gestion des risques qui sera engagé par le Groupe de la gestion des bâtiments des bureaux extérieurs du Bureau des services centraux d'appui, partagées à 50 % avec le projet Africa Hall de la Commission économique pour l'Afrique.^e Le budget prévu pour la société de conseil principale correspond au montant combiné des catégories de dépenses des services de conception et de gestion des travaux de construction. Il a été comptabilisé au même niveau que dans le rapport précédent (A/71/333). Au 1^{er} juillet 2017, le dossier de passation de marché de la société de conseil principale se trouvait à la Division des achats du Bureau des services centraux d'appui et au Comité des marchés du Siège.^f Hausse des coûts estimée à un taux annuel de 4 %.
