



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
18 November 2021
Russian
Original: English

Семьдесят шестая сессия

Пункт 138 повестки дня

Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год

Ход ремонта Дома Африки в комплексе Экономической комиссии для Африки в Аддис-Абебе

Четырнадцатый доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о предлагаемом бюджете по программам на 2022 год

I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе ремонта Дома Африки в комплексе Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-Абебе ([A/76/308](#)). В ходе рассмотрения доклада члены Консультативного комитета встречались в онлайн-режиме с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения, а в заключение направили письменные ответы, датированные 17 ноября 2021 года.

2. В докладе Генерального секретаря, представленном в соответствии с разделом X резолюции [75/253](#) А Генеральной Ассамблеи, приводится обновленная информация о проекте со времени выхода предыдущего доклада Генерального секретаря о ходе работ ([A/75/319](#)), включая информацию о разработке проектной документации, закупочной деятельности, управлении проектом, управлении рисками, ходе строительства и состоянии добровольных взносов. Доклад содержит также обновленный график осуществления проекта и пересмотренную смету расходов. В ответ на запрос Консультативному комитету было представлено сопоставление пересмотренной сметы расходов, содержащейся в последнем докладе Генерального секретаря, и сметы расходов, первоначально утвержденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [70/248](#) А, которое приводится в приложение I к настоящему докладу.



II. Ход ремонта Дома Африки

Сотрудничество с правительством принимающей страны и другими государствами-членами

3. Генеральный секретарь указывает на то, что после заключения с правительством Эфиопии соглашения, позволяющего беспрепятственно импортировать товары и услуги для целей этого проекта, с местными властями в рамках проекта было налажено конструктивное и эффективное сотрудничество (A/76/308, п. 32). **Консультативный комитет выражает признательность принимающей стране за ее продолжающуюся поддержку, оказываемую ЭКА, и рассчитывает на то, что Генеральный секретарь будет и впредь взаимодействовать с принимающей страной, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта.**

4. Генеральный секретарь представляет также информацию о своем подходе к привлечению добровольных взносов для проекта, в том числе посредством продвижения проекта на крупных мероприятиях и конференциях, которые из-за последствий пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) в течение отчетного периода были отменены, а также посредством разработки надежной стратегии мобилизации ресурсов и найма эксперта по мобилизации ресурсов (там же, пп. 21 с), 33 и 36). **Комитет призывает Генерального секретаря продолжать взаимодействовать также с другими государствами-членами в целях изыскания добровольных взносов, включая взносы в натуральной форме, и других форм поддержки этого проекта.**

5. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что ключевые элементы стратегии мобилизации ресурсов, которую эксперт должен разработать к концу 2021 года, включают: а) проведение анализа сильных и слабых мест, возможностей и угроз, связанных с проектом ремонта Дома Африки, с целью выявления факторов, стимулирующих заинтересованность со стороны доноров; б) выявление более 150 потенциальных клиентов и определение их приоритетности на основе имеющейся контактной информации и результатов камеральных исследований; в) сбор деловой информации и разработка планов информационно-разъяснительной работы с наиболее перспективными клиентами на основе данных аналитического обзора, предусмотренного в пункте б); г) установление 12–15 контактов с выявленными потенциальными клиентами с целью определить тех, кто готов участвовать; и е) разработка плана действий с установленными сроками и распределение заданий среди исполнителей в ЭКА. Комитет был проинформирован также о том, что два сотрудника Секции партнерских связей и мобилизации ресурсов ЭКА не обладают необходимым опытом для оказания вышеуказанных услуг и что привлечение эксперта в 2021 году обойдется в 33 600 долл. США. **Консультативный комитет не убежден в необходимости привлечения внешних экспертов для выполнения вышеупомянутых задач, выражает свою обеспокоенность тем, что реализация ключевых аспектов стратегии мобилизации ресурсов ЭКА не осуществляется собственными силами, и надеется, что в дальнейшем ЭКА будет прилагать все усилия для мобилизации добровольных взносов, используя имеющиеся кадровые ресурсы.**

Руководство и административное управление проектом

6. В своем докладе Генеральный секретарь подробно описывает структуру управления проектом, включая заседания комитета заинтересованных сторон и Консультативного совета, которые состоялись в отчетный период (там же, пп. 8–13). Заказчиком проекта продолжает оставаться Исполнительный секретарь ЭКА, а структура общего управления проектом выглядит следующим образом: а) комитет заинтересованных сторон проводит заседания, цель которых заключается в том, чтобы держать заказчика проекта и основные заинтересованные организации в курсе событий и информировать их о текущем состоянии проекта и подверженности рискам, а также содействовать им в процессе принятия решений; б) заседания Консультативного совета проводятся для предоставления заказчику проекта рекомендаций о способах обеспечения защиты проекта и его реализации; в) координация с Центральными учреждениями осуществляется посредством проведения со Службой по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе Управления по планированию программ, финансам и бюджету регулярных заседаний, посвященных различным функциям управления проектом, включая управление преобразованиями и отчетность о состоянии дел, техническое руководство и консультирование, а также накопленный опыт и передовые наработки других текущих проектов капитального строительства; и д) проводятся консультации с международной профессиональной фирмой, оказывающей поддержку Службе по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе в предоставлении заказчику проекта независимых услуг по управлению рисками, связанными со строительством (там же, пп. 14–16).

7. Что касается группы по управлению проектом ЭКА, то в докладе Генерального секретаря перечислены временные должности, утвержденные Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/248 А, а именно: управляющий проектом (С-5), который подчиняется руководителю проекта — Административному директору ЭКА, и группа по проекту в составе архитектора/инженера (С-4), специалиста по закупкам (С-3), инженера по архитектурной, общестроительной и конструктивной части (национальный сотрудник-специалист), инженера по механическим и электрическим системам (национальный сотрудник-специалист), производителя работ (национальный сотрудник-специалист), помощника по бюджетно-финансовым вопросам (местный разряд), помощника по логистике и экспедиторским операциям (местный разряд) и административного помощника (местный разряд). Генеральный секретарь указывает также на то, что временная должность координатора проекта (С-4) по-прежнему входит в состав Службы по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе, обеспечивая поддержку в осуществлении проекта из Центральных учреждений, и что процесс заполнения временной должности ответственного за исполнение контрактов (С-3), утвержденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 75/253 А, идет полным ходом с расчетом на то, что кандидат приступит к работе к концу 2021 года. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что для дальнейшего надлежащего управления проектом на повседневной основе специальные проектные должности будут сохраняться до прогнозируемой даты завершения основной части работ по проекту в сентябре 2023 года (там же, пп. 17–20). В ответ на запрос Консультативному комитету был предоставлен сводный список специальных кадровых ресурсов, предназначенных для управления проектом на 2022 год, который приводится в таблице 1.

Таблица 1

Кадровое обеспечение проекта Экономической комиссии для Африки на 2022 год

<i>Специальная временная должность</i>	<i>Уровень</i>	<i>Дата утверждения</i>	<i>Положение дел с заполнением должности</i>	<i>Дата изменения</i>	<i>Предлагается ли сохранить в 2022 году?</i>
Управляющий проектом	C-5	07/2015	Заполнена	03/2016	Да
Архитектор/инженер	C-4	07/2016	Заполнена	08/2017	Да
Специалист по закупкам	C-3	07/2016	Упразднена/вакантна		Нет
Ответственный за исполнение контрактов	C-3	07/2021	Кандидат отобран	12/2021	Да
Инженер по архитектурной, общестроительной и конструктивной части	HCC-C	07/2016	Заполнена	09/2016	Да
Инженер по механическим и электрическим системам	HCC-C	07/2016	Заполнена	02/2017	Да
Производитель работ	HCC-B	07/2016	Заполнена	03/2017	Да
			Вакантна	10/2018	
			Заполнена	07/2021	
Помощник по бюджетно-финансовым вопросам	OO-7	07/2016	Заполнена	03/2017	Да
			Вакантна (в процессе приема на работу)	08/2021	
Помощник по логистике и экспедиторским операциям	OO-7	07/2016	Заполнена	08/2016	Да
			Вакантна (в процессе заполнения)	12/2020	
Административный помощник	OO-6	07/2015	Заполнена	03/2016	Да
Координатор проекта в Центральных учреждениях (пополам с ЭСКАТО)	C-4	01/2017	—	—	Да
Сотрудник по безопасности 1	OO-4	10/2017	Заполнена	09/2017	Да
Сотрудник по безопасности 2	OO-4	10/2017	Заполнена	08/2017	Да
Сотрудник по безопасности 3	OO-4	10/2017	Заполнена	10/2017	Да
Сотрудник по безопасности 4	OO-4	10/2017	Заполнена	08/2017	Да
Сотрудник по безопасности 5	OO-4	10/2017	Заполнена	10/2017	Да
Сотрудник по безопасности 6	OO-4	10/2017	Заполнена	08/2017	Да

Сокращения: ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; HCC-B — национальный сотрудник-специалист класса В; HCC-C — национальный сотрудник-специалист класса С.


8. Согласно представленной информации, временная должность специалиста по закупкам (С-3) является вакантной и ее не предлагается сохранять в 2022 году, а временная должность помощника по логистике и экспедиторским операциям (местный разряд), которая в настоящее время находится в процессе заполнения, с декабря 2020 года является вакантной и в 2022 году ее предлагается сохранить. **Консультативный комитет принимает к сведению предлагаемое упразднение временной должности специалиста по закупкам (С-3) в 2022 году. Принимая во внимание, что сложности с закупками являются одной из основных причин задержек в реализации проекта, Комитет надеется, что будет проведен анализ необходимости в данной временной должности и что в следующем докладе о ходе работ будет представлена обновленная информация. Комитет отмечает также, что почти год временная должность помощника по логистике и экспедиторским операциям (местный разряд) остается вакантной, и надеется, что ЭКА примет соответствующие меры для заполнения этой должности и представит обновленную информацию в контексте следующего доклада о ходе работ.**

9. В пунктах 21 и 22 своего доклада Генеральный секретарь обращает также внимание на услуги консультантов, привлеченных для поддержки проекта, включая одного куратора выставки, одного эксперта по реставрации произведений искусства и одного эксперта по мобилизации ресурсов (см. пп. 4 и 5 выше). Кроме того, отмечается, что ЭКА скорректировала объем услуг с ведущей консалтинговой компанией, с тем чтобы учесть продление сроков осуществления проекта, а также отразить дистанционное предоставление услуг в связи с пандемией COVID-19.

График осуществления проекта и управление рисками

10. В пунктах 2–7 своего доклада Генеральный секретарь излагает цели проекта и прогресс, достигнутый на момент составления доклада; данные на рисунке III доклада свидетельствуют о фактическом прогрессе и обновлении графика осуществления проекта по состоянию на 30 июня 2021 года (там же, п. 57). Генеральный секретарь сообщает, что стратегический план осуществления проекта предусматривает следующие компоненты: а) подготовительные работы раннего этапа (освобождение помещений); b) основные ремонтные работы; c) конференционные и информационные системы; d) реставрация произведений искусства; и e) организация постоянной выставки (там же, п. 37). В ответ на запрос Консультативный комитет получил скорректированный вариант графика реализации проекта, представленный в докладе Генерального секретаря (там же, рисунок III), который приводится на рисунке ниже и в котором указаны предполагаемые сроки завершения закупочных процессов по основным компонентам проекта ремонта.

График работ по проекту Экономической комиссии для Африки с указанием предполагаемых сроков начала и окончания присуждения контрактов на закупки

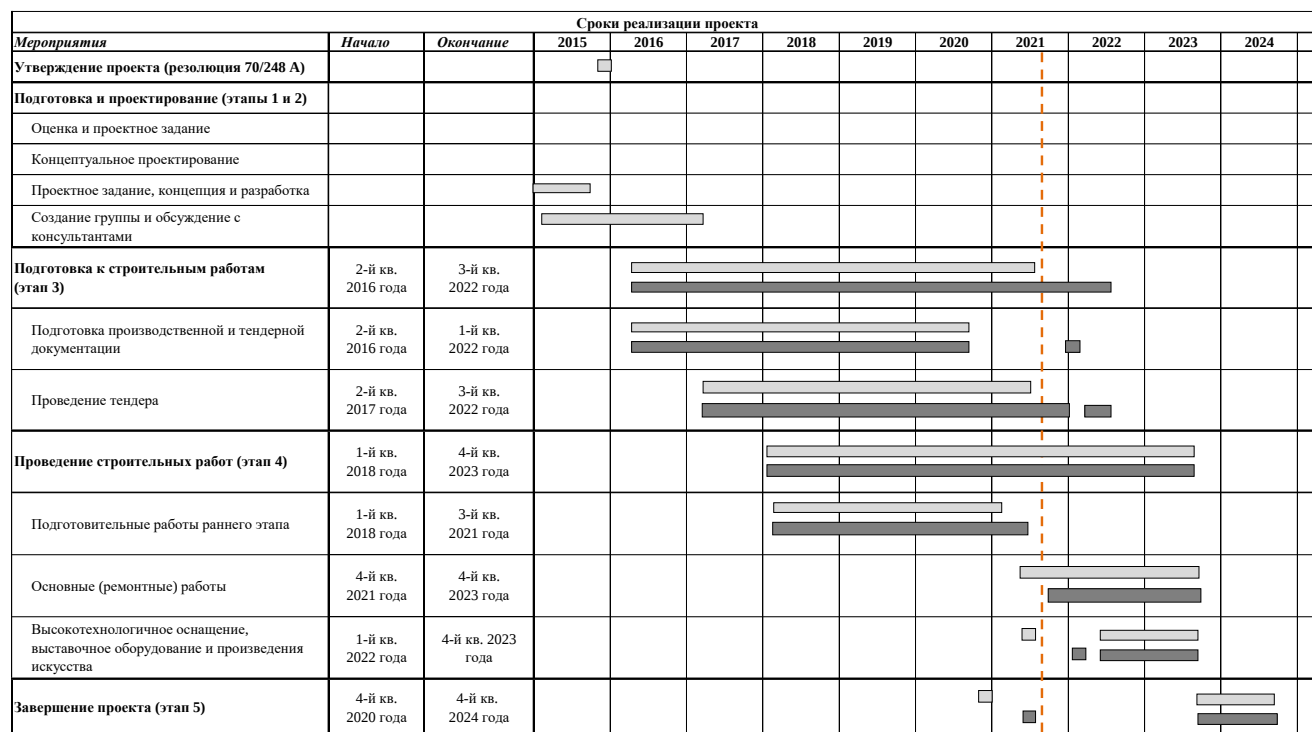

Условные обозначения:

-  График реализации проекта по предыдущему докладу Генерального секретаря (A/75/319).
 График реализации проекта по нынешнему докладу Генерального секретаря (A/76/308), относящемуся к сентябрю 2021 года.

11. Консультативный комитет отмечает, что информация о датах заключения контрактов для различных этапов проекта представлена на ежеквартальной основе и без достаточной детализации точной даты начала и окончания этапа или сравнительной информации по месяцам. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять в дальнейших докладах о ходе работ по проекту ЭКА, а также в других докладах о ходе работ по другим строительным проектам Организации Объединенных Наций график работ по тому или иному проекту в виде диаграмм и таблиц с указанием сроков реализации отдельных этапов и подэтапов, пояснений относительно любых задержек в выполнении графика и другой соответствующей информации.**

12. Что касается подготовительных работ раннего этапа, то после перебоев, связанных с пандемией COVID-19, подготовительные работы возобновились и были в основном завершены в июле 2021 года, а коммерческие арендаторы на момент составления доклада проводили работы по освобождению площадей Дома Африки (там же, п. 38). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что оставшиеся арендаторы освободят здание к концу 2021 года. В ходе рассмотрения предыдущего доклада о ходе работ (A/75/319) Консультативный комитет был проинформирован о том, что плохое техническое понимание подрядчиком подготовительных работ раннего этапа и задержки в планировании привели к отставанию от графика реализации этапа ранних работ, который первоначально должен был завершиться в октябре 2019 года, и что подрядчик представил различные требования о возмещении расходов, которые рассматриваются ЭКА (A/75/7/Add.15, пп. 9 и 10). В ответ на запрос Комитет был проинформирован о том, что ЭКА в консультации с Управлением по правовым

вопросам и Отделом закупок в Центральных учреждениях приняла решение не возмещать подрядчику ущерб, связанный с проведением подготовительных работ раннего этапа, на том основании, что его претензии не обоснованы и что ЭКА находится в процессе рассмотрения дополнительных претензий, выставленных подрядчиком для возмещения расходов, вызванных пандемией COVID-19. **Консультативный комитет надеется, что информация о любых потенциальных компенсациях по таким претензиям и их последствиях для общего объема ресурсов по проекту будет представлена в контексте следующего доклада о ходе работ. Комитет считает также, что Управлению по правовым вопросам следует провести обзор предыдущих судебных разбирательств и соответствующих контрактов на закупки, которые использовались Организацией, чтобы оценить, каким образом лучше всего снизить затраты на потенциальные судебные разбирательства и претензии подрядчиков.**

13. Что касается основных ремонтных работ, то в своем докладе Генеральный секретарь обращает внимание на то, что после расторжения в феврале 2020 года предыдущего контракта на основные ремонтные работы, которое привело к 22-месячной задержке завершения проекта до сентября 2023 года, в марте 2020 года был возобновлен процесс запроса предложений с использованием инновационного метода закупок, включающего многоступенчатую систему объявлений о принятии предложений в рамках диалога. Это позволило достичь удовлетворительного результата в плане получения отвечающих требованиям предложений и наметить предполагаемую дату заключения контракта в четвертом квартале 2021 года (A/76/308, п. 39). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что многоступенчатая система объявлений о принятии предложений в рамках диалога отличается от стандартного процесса запроса предложений тем, что она позволяет взаимодействовать с участниками торгов путем представления промежуточных технических и юридических предложений для предварительного отбора до представления окончательных предложений. С участниками торгов, чьи предложения прошли промежуточную оценку, Организация вступает в дальнейший диалог на индивидуальной основе, чтобы дать им возможность уточнить любые технические аспекты их окончательных предложений. Благодаря представлению участниками торгов промежуточных технических и юридических предложений, эта система позволяет также Организации Объединенных Наций на ранней стадии выявлять любые пункты, которые могут чрезмерно увеличить стоимость или риск проекта, и предоставлять разъяснения на протяжении всего этапа торгов. **Консультативный комитет выражает надежду на то, что Генеральной Ассамблее ко времени рассмотрения ею настоящего доклада будет представлена обновленная информация о ходе заключения контрактов на проведение основных ремонтных работ.**

14. Генеральный секретарь обращает также внимание на то, что в результате уроков, извлеченных из банкротства предыдущего подрядчика основных ремонтных работ, Организация в настоящее время проводит проверку деловой репутации участников торгов, в наибольшей степени соответствующих критериям, с целью обеспечения выполнения требований к финансовым показателям и что перенос ожидаемой даты присуждения контракта на более поздний срок по сравнению с ранее прогнозируемым апрелем 2021 года не повлияет на запланированные сроки завершения проекта (там же, пп. 4 и 39). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что поскольку дополнительная проверка финансовых показателей была технически сложной и заняла больше времени, чем планировалось изначально, ЭКА решила не проводить проверку всех участников торгов на начальном этапе или на этапе

предварительного отбора в ходе многоступенчатых торгов, решив ограничиться проверкой участников, прошедших техническую и коммерческую оценки. Кроме того, Комитет был проинформирован о том, что из-за более длительного времени, необходимого для завершения проверки на этапе, предшествующем заключению контракта, ЭКА и выбранный подрядчик будут стремиться проанализировать варианты ускоренного выполнения работ, чтобы в перспективе выполнить их менее чем за 30 месяцев, что позволит ЭКА уложиться в пересмотренный срок завершения работ — к сентябрю 2023 года. **Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря принять дополнительные меры для повышения эффективности управления и надзора за процессом присуждения контрактов путем, в частности, проведения тщательных проверок показателей деятельности участников торгов и их деловой репутации и осуществления постоянного контроля за работой отобранных подрядчиков и распространить соответствующую передовую практику и накопленный опыт на другие строительные проекты Организации Объединенных Наций.**

15. В пунктах 25–31 своего доклада Генеральный секретарь приводит обновленную информацию об управлении рисками и тех мерах реагирования на риски, которые должны быть приняты для снижения проектных рисков. Четвертый количественный анализ рисков (моделирование методом Монте-Карло)¹, проведенный в июне 2021 года, показал, что вероятность реализации проекта в рамках максимального утвержденного общего бюджета в размере 56,9 млн долл. США составляет 49 процентов (там же, п. 27 и рисунок I). Генеральный секретарь отмечает, что этот показатель выше уровня уверенности, который в 2020 году составлял 43 процента, и учитывает прогнозируемую задержку реализации проекта на 22 месяца и накопившуюся ранее 11-месячную задержку, а также дополнительные расходы, связанные с управлением проектом и принятием мер по смягчению последствий пандемии COVID-19. По результатам проведенного в 2021 году моделирования был также подготовлен обновленный анализ чувствительности затрат, при этом в порядке убывания были определены пять основных рисков: а) основные строительные работы (71 процент); б) риски, связанные с пандемией COVID-19 (38 процентов); в) споры с подрядчиками/проблемы с качеством работ (34 процента); г) конференционные и информационно-технические системы (26 процентов); и е) внесение изменений по требованию заказчика (25 процентов) (там же, пп. 29 и 30 и рисунок II). В связи с этим Генеральный секретарь ожидает, что уровень уверенности вновь повысится после заключения контракта на основные ремонтные работы. Сопоставление пяти основных рисков для проекта приводится в таблице 2 ниже.

¹ Метод статистического анализа, призванный обеспечить более глубокое понимание последствий рисков для того или иного проекта на основе применения ряда показателей, варьирующихся в пределах от минимального до максимального значения в зависимости от сроков и сметы расходов по этапам и компонентам, путем компьютерного моделирования на основе разбора нескольких произвольно выбранных вариантов осуществления проекта (A/75/7/Add.15, сноска 2).

Таблица 2

Сопоставление пяти основных рисков для проекта Экономической комиссии для Африки

<i>Предыдущие пять основных рисков (A/74/328, п. 32 и рисунок II)</i>	<i>Предыдущие пять основных рисков (A/75/319, п. 32 и рисунок II)</i>	<i>Текущие пять основных рисков (A/76/308, п. 30 и рисунок II)</i>
1. Внесение изменений по требованию заказчика (изменение проектных требований на позднем этапе)	1. Риск, связанный с пандемией COVID-19	1. Основные ремонтные работы
2. Внесение изменений по требованию заказчика (возможное увеличение объема работ)	2. Основные строительные работы	2. Риски, связанные с пандемией COVID-19
3. Отставание от графика	3. Изменение/модификация проектного задания по требованию заказчика	3. Споры с подрядчиками/проблемы с качеством работ
4. Конференционные и информационно-технические системы	4. Споры с подрядчиками/проблемы с качеством работ	4. Конференционные и информационно-технические системы
5. Споры с подрядчиками/проблемы с качеством работ	5. Конференционные и информационно-технические системы	5. Внесение изменений по требованию заказчика

16. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять в дальнейших докладах о ходе работ обновленные версии вышеприведенной таблицы 2 с сопоставлением пяти основных рисков по проекту ремонта в комплексе ЭКА, а также разъяснения, касающиеся последних изменений. Комитет надеется, что в будущих докладах о ходе реализации других строительных проектов Организации Объединенных Наций также будут содержаться подобные стандартизованные таблицы.

17. В ответ на запрос Консультативный комитет был подробно проинформирован о принятых Генеральным секретарем мерах по снижению рисков, в том числе о том, что задержка в ходе закупочных мероприятий может повлиять на своевременное выполнение основных строительных работ и привести к дополнительным расходам, если потребуются продлить срок работы специальной группы по управлению проектом и ведущей консалтинговой компании. **Принимая во внимание низкий уровень уверенности на данном этапе, Консультативный комитет рассчитывает на то, что Генеральный секретарь будет внимательно отслеживать и снижать риски по проекту, с тем чтобы обеспечить осуществление проекта в соответствии с объемом работ, бюджетом и пересмотренными сроками, утвержденными Генеральной Ассамблеей (см. п. 8 выше).**

18. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что, хотя пандемия COVID-19 продолжает представлять значительный риск для проекта в связи с возможными сбоями в цепи снабжения и нарушениями графика строительных работ, он по-прежнему уверен в реализации проекта в рамках максимального

общего бюджета в размере 56,9 млн долл. США, включая увеличение стоимости и непредвиденные расходы (там же, резюме и пп. 7 и 30 b)). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что, за исключением подготовительных работ раннего этапа, которые были в основном завершены в июле 2021 года, на данный момент не было заключено ни одного контракта на оказание услуг по четырем оставшимся компонентам ремонта и что ЭКА будет работать с подрядчиками, получившими контракт, над согласованием мер по оптимизации стоимости, чтобы избежать, наряду с увеличением расходов и использованием резервных бюджетных ассигнований, любого перерасхода средств, возникающего в результате значительных задержек в реализации проекта.

Использование местных материалов и знаний, применение стратегии энергоэффективности и соответствующее снижение затрат

19. В своем докладе Генеральный секретарь излагает подход, который необходимо применять для обеспечения использования материалов местного происхождения и производства, а также местной рабочей силы (там же, пп. 44–46). Как указывается в докладе, ЭКА продолжает использовать соответствующий опыт, накопленный в ходе осуществления других проектов капитального строительства Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в руководящих принципах управления строительными проектами, и после заключения контракта на строительные работы для Дома Африки в следующий доклад о ходе работ включит информацию о своем собственном опыте и передовых наработках. **Консультативный комитет напоминает о своих соответствующих рекомендациях, представленных в его предыдущем докладе (A/75/7/Add.15, пп. 18 и 20), и вновь подчеркивает важность использования материалов местного происхождения и производства, а также местной рабочей силы и опыта и ожидает представления обновленной информации по этому вопросу в будущих докладах о ходе работы.**

20. Генеральный секретарь указывает далее на то, что ЭКА будет проводить измерения и вести учет потребления энергии в предстоящем шестимесячном периоде с целью установить в первом квартале 2022 года базовый показатель потребления энергии и выполнить просьбы Генеральной Ассамблеи по этому вопросу (A/76/308, п. 55; см. также резолюцию 75/253 А, разд. X, п. 13). **Комитет надеется, что Генеральный секретарь оперативно проведет необходимый анализ для установления базового показателя энергоэффективности и представит Генеральной Ассамблее в контексте следующего доклада о ходе работ подробную обновленную информацию, в том числе о полученной экономии средств. Кроме того, в отношении обмена информацией о передовой практике и извлеченных уроках, применимых ко всем аспектам проекта, Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию о том, что следует обмениваться знаниями, полученными в ходе осуществления других строительных проектов Организации Объединенных Наций, для их возможного использования в ЭКА (см. также A/75/7/Add.11, пункт 23).**

III. Расходы по проекту и прогнозируемые издержки

21. Подробная информация о расходах по проекту и прогнозируемых издержках приводится в докладе Генерального секретаря (A/76/308, пп. 58–62 и приложение), в котором он отмечает, что в своих резолюциях 71/272 А, 72/262 А, 73/279 А и 74/263 Генеральная Ассамблея утвердила ассигнования на этот проект в объеме 36 541 700 долл. США на период 2016–2021 годов.

22. Генеральный секретарь обращает внимание на то, что совокупные расходы по состоянию на 30 июня 2021 года составили 12 341 500 долл. США, а прогнозируемые расходы на оставшуюся часть 2021 года составляют 4 838 900 долл. США (там же, п. 59 и таблица 1). Относительно низкий уровень расходов объясняется тем, что основной комплекс ремонтных работ, являющийся самым крупным комплексом работ в рамках проекта ремонта Дома Африки, не был выполнен так, как планировалось. Ожидается, что в конце 2021 года останется неиспользованным остаток средств в размере 19 370 300 долл. США. Консультативный комитет запросил, но не получил информацию о ежемесячных расходах за период 2016–2021 годов, а также прогнозы ежемесячных расходов на оставшуюся часть 2021 года и на 2022 год. **Консультативный комитет надеется, что во время рассмотрения Генеральной Ассамблеей настоящего доклада ей будет представлена подробная информация о расходах.**

23. Подробная информация об общем прогнозируемом объеме потребностей в ресурсах на 2022 год в размере 17 954 400 долл. США приводится в пункте 61 и в таблице 2 доклада. Эти потребности складываются из следующих компонентов:

а) 992 100 долл. США по разделу 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке», которые предназначены для: i) дальнейшего финансирования нынешней специальной управленческой группы и 50 процентов расходов на временную должность координатора проекта (С-4), базирующегося в Центральных учреждениях (совместно с расходами по проекту на замену офисных корпусов А–J в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби) (955 100 долл. США); ii) оплаты услуг индивидуальных консультантов, по запросу предоставляющих экспертную помощь для нужд специальной группы по проекту (30 000 долл. США); и iii) оплаты поездок членов группы по управлению проектом, которые будут ограничены до необходимого минимума, также с учетом предполагаемых последствий ограничений на поездки в связи с пандемией COVID-19 (7000 долл. США);

б) 16 777 700 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений», которые предназначены для: i) покрытия расходов на строительство (14 324 200 долл. США) для завершения подготовительных работ раннего этапа и выполнения основных ремонтных работ, работ по монтажу конференционных и информационно-технических систем и сетей и работ по реставрации произведений искусства; ii) оплаты профессиональных услуг (1 157 100 долл. США), включая услуги ведущей консалтинговой компании для доработки проектной документации и оказания специальной группе по проекту поддержки в деле управления строительством и осуществления надзора за производством строительных работ, услуги профессиональной компании по управлению рисками и другие услуги, такие как услуги сторонних консультантов для вынесения независимых заключений в отношении разработки проектной документации или по другим вопросам, для которых важна внешняя оценка; и iii) резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов (1 296 400 долл. США) для покрытия неотъемлемых рисков в случае их возникновения;

с) 184 600 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» для оплаты услуг по обеспечению безопасности, оказываемых шестью специальными сотрудниками по безопасности.

24. По запросу Консультативного комитета ему была предоставлена дополнительная информация об использовании резерва на непредвиденные расходы с момента начала реализации проекта, которая представлена в таблице 3. Комитет отмечает, что после того, как Генеральная Ассамблея в резолюции [70/248 А](#) утвердила сумму в размере 8 736 900 долл. США, по линии резервного финансирования была использована или зарезервирована для использования сумма в размере 5 609 200 долл. США. **Консультативный комитет надеется, что во время рассмотрения Генеральной Ассамблеей настоящего доклада ей будет представлена обновленная информация об использовании резервного финансирования.**

Таблица 3

Обзор использования резервных средств после утверждения проекта ремонта Дома Африки

(В долл. США)

Год	Доклад Генерального секретаря	Имеющийся резервный бюджет	Использованный (выделенный) резервный бюджет	Использование (резервирование) средств на непредвиденные расходы
2015	A/70/363 и A/70/363/Corr.1	8 736 900	—	Утверждено резолюцией 70/248 А
2016	A/71/370	8 598 400	138 500	Дополнительные услуги ведущей консалтинговой компании и корректировка сметы расходов
2017	A/72/374	8 173 800	424 600	Корректировка сметы расходов в соответствии с пунктом 67 доклада A/72/374
2018	A/73/355	8 271 100	(97 300)	Корректировка сметы расходов в соответствии с пунктом 69 d) доклада A/73/355
2019	A/74/328	7 332 700	938 400	Корректировка сметы расходов в соответствии с сноской e) в приложении к докладу A/74/328
2020	A/75/319	4 015 000	3 317 700	Корректировка сметы расходов в соответствии с сноской f) в приложении к докладу A/75/319
2021	A/76/308	3 127 700	887 300	Корректировка сметы расходов, как показано в приложении к докладу A/76/308 , приложение
		5 609 200		

25. Генеральный секретарь указывает на то, что расходы в объеме 17 954 400 долл. США на 2022 год будут финансироваться за счет ассигнований и взносов, уже начисленных государствам-членам в предыдущие годы. Поскольку финансирование проекта проводится по многолетнему счету незавершенного строительства, утвержденному Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [70/248 А](#) (разд. IX, п. 27), ожидаемый на конец 2021 года неизрасходованный остаток средств в размере 19 361 300 долл. США будет перенесен на следующий период и покроет потребности в финансировании в 2022 году ([A/76/308](#), п. 62). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что по состоянию на 30 сентября 2021 года прогнозируемый неиспользованный остаток средств по-прежнему составлял 19 361 300 долл. США (оставался таким же, как и по состоянию на 30 июня 2021 года).

IV. Прочие вопросы

Ресурсы на строительные проекты Организации Объединенных Наций

26. Консультативный комитет запросил информацию о динамике потребностей в период с 2014 по 2022 год по всем отдельным строительным проектам Организации Объединенных Наций, а именно: а) ремонт Дома Африки в комплексе ЭКА; б) повышение сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана; в) ремонт Северного здания в Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна; d) стратегический план сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве; е) решение проблемы ухудшения состояния и ограниченности возможностей конференционных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби; и f) замена офисных корпусов А–J в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби.

27. В приложении II к настоящему докладу кратко излагается дополнительная информация, полученная Комитетом, в том числе по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и другим разделам бюджета по программам, предусматривающим финансирование мер по обеспечению управления проектами, охраны и безопасности и проведения первоначальных технико-экономических обоснований, необходимых для реализации отдельных проектов капитального строительства. Комитет также запросил и получил информацию о динамике выделения ресурсов на проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений в соответствии с разделом 33. Три таблицы, содержащиеся в приложении II, различаются в части финансирования стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в 2022 году, предоставляя три возможных варианта финансирования стратегического плана сохранения наследия, а именно: на основе прогнозируемых годовых расходов (таблица 1), на основе подхода, подразумевающего авансовое выделение ассигнований (таблица 2) и на основе подхода, подразумевающего ежегодное выделение равной суммы ассигнований (таблица 3).

V. Заключение

28. Рекомендация Генерального секретаря относительно мер, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее, приводится в пункте 64 его доклада. **С учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять к сведению доклад Генерального секретаря.**

Приложение I

Пересмотренная смета расходов, приведенная в последнем докладе Генерального секретаря (A/76/308), в сопоставлении со сметой расходов, утвержденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/248 А

(В тыс. долл. США)

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого	Данные, представленные в докладе A/75/319	Изменение	Данные, представленные в докладе A/70/363	Изменение
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»														
1. Расходы на строительство													31 236,0	5 175,4
1.1 Строительные издержки	—	—	54,6	354,3	14,7	1 917,9	12 282,1	12 275,0	1 784,5	28 683,2	28 683,1	0,1		
1.2 Подготовительные работы	—	—	459,6	1 384,1	129,3	132,2	32,1	—	—	2 137,2	2 137,3	(0,1)		
1.3 Конференционные и информационно-технические системы	—	—	—	—	—	—	1 500,0	2 300,0	100,0	3 900,0	3 900,0	—		
1.4 Реставрация произведений искусства	—	—	—	—	—	40,0	110,0	730,0	110,0	990,0	990,0	—		
1.5 Постоянная выставка	—	—	—	—	—	—	400,0	250,0	51,0	701,0	701,0	—		
2. Профессиональные услуги			—	—	—								6 361,4	1 645,2
2.1 Услуги ведущей консалтинговой компании	983,2	1 733,3	911,6	586,4	308,8	623,9	1 126,9	1 126,9	366,1	7 767,1	6 699,9	1 067,2		
2.2 Фирма по управлению рисками	—	—	52,8	—	30,3	20,2	20,2	16,8	—	140,4	140,4	(10,1)		
2.3 Прочие услуги	1,6	10,4	49,6	2,5	—	10,0	10,0	10,0	5,0	99,1	114,1	(15,0)		
3. Увеличение стоимости	—	—	—	—	—	1 373,8	—	—	—	1 373,8	1 373,8	—	6 086,9	(4 713,1)
4. Непредвиденные расходы	—	—	—	—	—	230,6	1 296,4	1 399,2	202,4	3 127,7	4 015,0	(887,3)	8 736,9	(5 609,2)
Итого, раздел 33	984,8	1 743,6	1 528,3	2 327,3	483,2	4 347,8	16 777,7	18 107,9	2 619,0	48 919,5	48 754,6	164,9	52 421,2	(3 501,7)

Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке»

5. Управление проектом													3 778,8	3 206,4
5.1 Специальная группа по управлению проектом и вспомогательному обслуживанию	320,7	869,1	766,0	883,5	839,2	885,0	858,7	741,8	—	6 163,9	6 203,7	(39,7)		
5.2 Специальный координатор в Центральных учреждениях	—	14,2	93,5	96,1	99,0	96,4	96,4	81,2	—	576,6	576,4	0,2		

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого	Данные, представленные в докладе А/75/319	Изменение	Данные, представленные в докладе А/70/363	Изменение
5.3 Услуги консультантов и экспертов	–	5,6	19,5	9,6	–	120,0	30,0	30,0	30,0	244,7	364,7	(120,0)		
5.4 Поездки группы по управлению проектом	16,5	20,5	37,7	15,6	–	7,0	7,0	5,6	0,0	110,0	117,0	(7,0)	95,5	14,5
Итого, раздел 18	337,2	909,3	916,7	1 004,9	938,1	1 108,3	992,1	858,6	30,0	7 095,2	7 261,7	(166,4)	3 874,3	3 220,9
Раздел 34 «Охрана и безопасность»														
6. Потребности, связанные с обеспечением безопасности	–	26,7	104,1	113,7	123,6	182,6	184,6	146,2	–	881,6	880,0	1,5	600,8	280,8
Итого, раздел 34	–	26,7	104,1	113,7	123,6	182,6	184,6	146,2	–	881,6	880,0	1,5	600,8	280,8
Всего	1 322,0	2 679,7	2 549,2	3 445,9	1 544,9	5 638,8	17 954,4	19 112,6	2 649,7	56 896,3	56 896,3	0,0	56 896,3	0,0

Приложение II

Ресурсы Организации Объединенных Наций на цели строительства: три варианта для принятия Генеральной Ассамблеей возможного решения

Таблица 1

Ресурсы, необходимые на период 2014–2022 годов по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и другим разделам бюджета, касающимся строительных работ, в случае утверждения Генеральной Ассамблеей объема ресурсов для стратегического плана сохранения наследия на 2022 год на основе прогнозируемых годовых расходов

(В долл. США)

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ^a
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»									
Проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	15 139 100
Отдельные проекты									
Стратегический план сохранения наследия ^b	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	69 130 400
Дом Африки ^c	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—
Повышение сейсмостойкости	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300
Ремонт Северного здания	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800
Замена офисных корпусов А–J	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300
Конференционные помещения в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600
Итого, отдельные проекты	15 346 400	28 499 400	39 522 500	17 396 300	33 904 900	49 440 800	56 584 900	66 940 800	90 382 800
Итого, раздел 33	49 063 000	62 420 100	66 071 500	43 908 600	57 052 700	73 004 600	71 046 100	79 764 500	105 521 900
Другие разделы									
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке» (ЭКА/(Дом Африки) ^c	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (ЭКА/Дом Африки) ^c	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—
Раздел 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЭСКАТО/повышение сейсмостойкости)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ^a
Раздел 21 «Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке и Карибском бассейне» (ЭКЛАК/ремонт Северного здания)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	413 600
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/конференционные помещения)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	1 081 400
Итого, другие разделы	—	—	480 000	1 316 500	1 916 000	3 056 200	3 840 500	2 553 500	4 030 500
Всего	49 063 000	62 420 100	66 551 500	45 225 100	58 968 700	76 060 800	74 886 600	82 318 000	109 552 400

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.

^a До пересчета.

^b За вычетом ежегодных выплат по займам, связанным со стратегическим планом сохранения наследия, которые включены в проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра).

^c Потребности в ресурсах на 2022 год должны финансироваться за счет неизрасходованного остатка средств по состоянию на конец 2021 года.

Таблица 2

Ресурсы, необходимые на период 2014–2022 годов по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и другим разделам бюджета, касающимся строительных работ, в случае утверждения Генеральной Ассамблеей объема ресурсов для стратегического плана сохранения наследия на 2022 год на основе подхода, подразумевающего авансовое выделение ассигнований

(В долл. США)

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ^a
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»									
Проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	15 139 100
Отдельные проекты									
Стратегический план сохранения наследия ^b	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	238 178 700
Дом Африки ^c	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—
Повышение сейсмостойкости	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300
Ремонт Северного здания	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800
Замена офисных корпусов А–J	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300
Конференционные помещения в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600
Итого, отдельные проекты	15 346 400	28 499 400	39 522 500	17 396 300	33 904 900	49 440 800	56 584 900	66 940 800	259 431 100
Итого, раздел 33	49 063 000	62 420 100	66 071 500	43 908 600	57 052 700	73 004 600	71 046 100	79 764 500	274 570 200
Другие разделы									
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке» (ЭКА/(Дом Африки) ^c	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (ЭКА/Дом Африки) ^c	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—
Раздел 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЭСКАТО/повышение сейсмостойкости)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900
Раздел 21 «Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке и Карибском бассейне» (ЭКЛАК/ремонт Северного здания)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов А–J)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ^a
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов А–J)	–	–	–	–	–	–	225 100	51 600	413 600
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/конференционные помещения)	–	–	–	–	–	–	470 000	494 000	1 081 400
Итого, другие разделы	–	–	480 000	1 316 500	1 916 000	3 056 200	3 840 500	2 553 500	4 030 500
Всего	49 063 000	62 420 100	66 551 500	45 225 100	58 968 700	76 060 800	74 886 600	82 318 000	278 600 700

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.

^a До пересчета.

^b За вычетом ежегодных выплат по займам, связанным со стратегическим планом сохранения наследия, которые включены в проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра).

^c Потребности в ресурсах на 2022 год должны финансироваться за счет неизрасходованного остатка средств по состоянию на конец 2021 года.

Таблица 3

Ресурсы, необходимые на период 2014–2022 годов по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и другим разделам бюджета, касающимся строительных работ, в случае утверждения Генеральной Ассамблеей объема ресурсов для стратегического плана сохранения наследия на 2022 год на основе подхода, подразумевающего ежегодное выделение равной суммы

(В долл. США)

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ^a
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»									
Проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	15 139 100
Отдельные проекты									
Стратегический план сохранения наследия ^b	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	79 392 900
Дом Африки ^c	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—
Повышение сейсмостойкости	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300
Ремонт Северного здания	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800
Замена офисных корпусов А–J	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300
Конференционные помещения в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600
Итого, отдельные проекты	15 346 400	28 499 400	39 522 500	17 396 300	33 904 900	49 440 800	56 584 900	66 940 800	100 645 300
Итого, раздел 33	49 063 000	62 420 100	66 071 500	43 908 600	57 052 700	73 004 600	71 046 100	79 764 500	115 784 400
Другие разделы									
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке» (ЭКА/(Дом Африки) ^c	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (ЭКА/Дом Африки) ^c	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—
Раздел 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЭСКАТО/повышение сейсмостойкости)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ^a
Раздел 21 «Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке и Карибском бассейне» (ЭКЛАК/ремонт Северного здания)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов А–J)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов А–J)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	413 600
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/конференционные помещения)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	1 081 400
Итого, другие разделы	—	—	480 000	1 316 500	1 916 000	3 056 200	3 840 500	2 553 500	4 030 500
Всего	49 063 000	62 420 100	66 551 500	45 225 100	58 968 700	76 060 800	74 886 600	82 318 000	119 814 900

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.

^a До пересчета.

^b За вычетом ежегодных выплат по займам, связанным со стратегическим планом сохранения наследия, которые включены в проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра).

^c Потребности в ресурсах на 2022 год должны финансироваться за счет неизрасходованного остатка средств по состоянию на конец 2021 года.
