



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
2 November 2021  
Russian  
Original: English

Семьдесят шестая сессия

Пункт 138 повестки дня

Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год

## Проект повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке

Девятый доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о предлагаемом бюджете по программам на 2022 год

### I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел предварительный вариант доклада Генерального секретаря о проекте повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке (ЭСКАТО) ([A/76/313](#)). В ходе рассмотрения доклада члены Комитета провели онлайн-совещания с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения, а в заключение направили письменные ответы, датированные 8 октября 2021 года.

2. Проект повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке является одним из рассчитанных на ближайшую перспективу крупных строительных проектов, о которых говорится в докладе Генерального секретаря о стратегическом обзоре капитальных активов ([A/72/393](#))<sup>1</sup>. Проект повышения сейсмостойкости был предложен для здания секретариата ЭСКАТО и служебных зданий, которые были построены в 1975 году и, как было установлено, не отвечают действующим требованиям сейсмостойкости. В пятом докладе Генерального секретаря о проекте повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования, представленном во исполнение положений раздела XII

<sup>1</sup> Консультативный комитет вынес соответствующие замечания и рекомендации в своем докладе о стратегическом обзоре капитальных активов ([A/72/7/Add.9](#)). В своих предыдущих докладах по проекту ЭСКАТО ([A/75/7/Add.10](#), [A/74/7/Add.8](#), [A/72/7/Add.6](#), [A/71/570](#) и [A/70/7/Add.3](#)) Комитет рассмотрел ряд конкретных вопросов.



резолюции [74/263](#) А Генеральной Ассамблеи, содержится информация о прогрессе, достигнутом со времени представления предыдущего доклада Генерального секретаря по этому вопросу.

## II. Ход осуществления проекта

### **Сотрудничество с правительством принимающей страны и другими государствами-членами**

3. Информация о сотрудничестве с правительством принимающей страны представлена в пунктах 30–34 доклада Генерального секретаря. Хотя в 2021 году из-за пандемии COVID-19 очные встречи представителей ЭСКАТО и принимающей страны не проводились, ЭСКАТО по-прежнему поддерживала тесные контакты с принимающей страной, которая продолжила оказывать проекту поддержку по целому ряду направлений на этапе проведения торгов. Например, принимающая страна содействовала налаживанию партнерских отношений с властями на местном и национальном уровнях и способствовала распространению подготовленного ЭСКАТО объявления о конкурсе на проведение общестроительных работ среди членов Ассоциации подрядчиков Таиланда с целью привлечь больше квалифицированных и опытных компаний. **Консультативный комитет выражает признательность принимающей стране за постоянную поддержку, оказываемую ею ЭСКАТО, и рассчитывает на то, что Генеральный секретарь будет и впредь взаимодействовать с принимающей страной, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта.**

4. Сведения о сотрудничестве с другими государствами-членами представлены в пунктах 28 и 29 доклада Генерального секретаря. ЭСКАТО продолжала запрашивать добровольные взносы у государств-членов через Консультативный комитет постоянных представителей и других представителей, назначаемых членами Комиссии. Генеральный секретарь сообщает также, что исполнительный директор проекта проводила двусторонние встречи с государствами-членами, чтобы просить их поддержать проект добровольными взносами, включая неденежные взносы в виде предоставления технических экспертов на должности младших сотрудников категории специалистов для работы по задачам проекта в областях энергоэффективности, сейсмической безопасности и экологичности, однако конкретных предложений не поступило ([A/76/313](#), пп. 28 и 29, и [A/75/7/Add.10](#), пп. 3 и 4). **Консультативный комитет признает усилия ЭСКАТО и призывает продолжать усилия для найма младших сотрудников категории специалистов. Комитет призывает также Генерального секретаря продолжать взаимодействовать с государствами-членами в целях мобилизации для проекта добровольных взносов и других видов поддержки.**

### **Руководство проектом**

5. В докладе Генерального секретаря приводится информация о руководстве и управлении проектом ([A/76/313](#), пп. 9–13). За проект по-прежнему отвечает Исполнительный секретарь ЭСКАТО, а структура управления проектом осталась неизменной: продолжает работать комитет заинтересованных сторон, в который входят структуры, арендующие помещения ЭСКАТО, а также продолжаются координационные совещания со Службой по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе, базирующейся в Центральном учреждении Организации Объединенных Наций, и независимой фирмой по управлению рисками.

### Кадровое обеспечение проекта

6. В докладе Генерального секретаря приводится информация о кадровом обеспечении проекта (A/76/313, пп. 14–16). В ответ на запрос Консультативному комитету была предоставлена информация о кадровом обеспечении проекта с момента его начала в 2017 году до 2022 года (см. таблицу 1).

Таблица 1

### Кадровое обеспечение проекта ЭСКАТО

(В долл. США)

| <i>Штатное расписание, взятое из<br/>сметы расходов ЭСКАТО</i>                                                  | <i>2017 год</i> | <i>2018 год</i> | <i>2019 год</i> | <i>2020 год</i> | <i>2021 год</i>                                                      | <i>2022 год</i>                                                                                    | <i>Прогнозируе-<br/>мые расходы<br/>на персонал,<br/>2022 год</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Группа по управлению про-<br/>ектом и вспомогательному<br/>обслуживанию</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                                                                      |                                                                                                    |                                                                   |
| 1 руководитель проекта (С-5)                                                                                    | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 239 800                                                           |
| 1 инженер-проектировщик<br>(С-4)                                                                                | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 227 600                                                           |
| 1 инженер-строитель (С-3)                                                                                       | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена       |                                                                      |                                                                                                    | —                                                                 |
| 1 смотритель механических,<br>электрических и сантехниче-<br>ских систем здания (НСС)                           |                 |                 | заполнена       | заполнена       | заполнена                                                            |                                                                                                    | —                                                                 |
| 1 специалист по координации<br>материально-технического<br>обеспечения (НСС)                                    |                 |                 | заполнена       | заполнена       | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 96 000                                                            |
| 1 специалист по безопасно-<br>сти проекта (НСС)                                                                 |                 |                 |                 |                 | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 58 000                                                            |
| 1 административно-<br>финансовый помощник (МР)                                                                  | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 58 000                                                            |
| 1 сотрудник охраны в под-<br>менном помещении (МР)                                                              |                 |                 |                 |                 | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 58 000                                                            |
| 1 сотрудник охраны в под-<br>менном помещении (МР)                                                              |                 |                 |                 |                 |                                                                      |                                                                                                    | —                                                                 |
| 1 сотрудник поддержки ИТ в<br>подменном помещении (МР)                                                          |                 |                 | заполнена       | заполнена       | заполнена                                                            | заполнена                                                                                          | 58 000                                                            |
| 1 сотрудник поддержки ИТ в<br>подменном помещении (МР)                                                          |                 |                 |                 |                 |                                                                      |                                                                                                    | —                                                                 |
| <b>Вспомогательное обслужи-<br/>вание проекта</b>                                                               |                 |                 |                 |                 |                                                                      |                                                                                                    |                                                                   |
| 1 координатор проекта (С-4),<br>базирующийся в Централь-<br>ных учреждениях Организа-<br>ции Объединенных Наций | заполнена       | заполнена       | заполнена       | заполнена       | Расходы с<br>ЭСКАТО<br>не разделя-<br>ются;<br>должность<br>вакантна | Заполнена;<br>совместное<br>несение расхо-<br>дов ЭСКАТО<br>и ЭКА возоб-<br>новится в<br>2022 году | 125 300                                                           |

| Штатное расписание, взятое из<br>сметы расходов ЭСКАТО                  |           |           |           |           |                                                                             |          | Прогнозируе-<br>мые расходы<br>на персонал,<br>2022 год |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год                                                                    | 2022 год |                                                         |
| 1 специалист по закупкам<br>(С-3);                                      | заполнена | заполнена | заполнена | заполнена | Заполнена;<br>срок дого-<br>вора исте-<br>кает 31 де-<br>кабря<br>2021 года |          | —                                                       |
| <b>Итого, прогнозируемые<br/>расходы на персонал,<br/>2022 год</b>      |           |           |           |           |                                                                             |          | <b>920 700</b>                                          |
| <b>Расходы на поездки,<br/>2022 год</b>                                 |           |           |           |           |                                                                             |          | <b>13 600</b>                                           |
| <b>Всего, расходы на персо-<br/>нал, включая расходы на<br/>поездки</b> |           |           |           |           |                                                                             |          | <b>934 300</b>                                          |

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки, ИТ — информационные технологии, НСС — национальный сотрудник-специалист, МР — местный разряд.

7. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что после 31 декабря 2021 года должность специалиста по закупкам (С-3) более не потребуется, поскольку процесс закупок завершен (см. п. 8 ниже). Комитет был также проинформирован о том, что ЭСКАТО приняла меры для по компенсации некоторых перерасходов (см. п. 19 ниже), приостановив отбор на утвержденные должности в проекте, в которых нет срочной необходимости из-за сдвигов в графике проекта, и перераспределив некоторые задачи, и поэтому, например, набор на одну из двух утвержденных должностей помощников по информационным технологиям был отложен. **Консультативный комитет принимает к сведению представленную информацию и рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря включать обновленные варианты вышеприведенной таблицы 1 с пояснениями в доклады о ходе проекта ЭСКАТО, а также в доклады о ходе других строительных проектов Организации Объединенных Наций в целях стандартизации формата отчетности.**

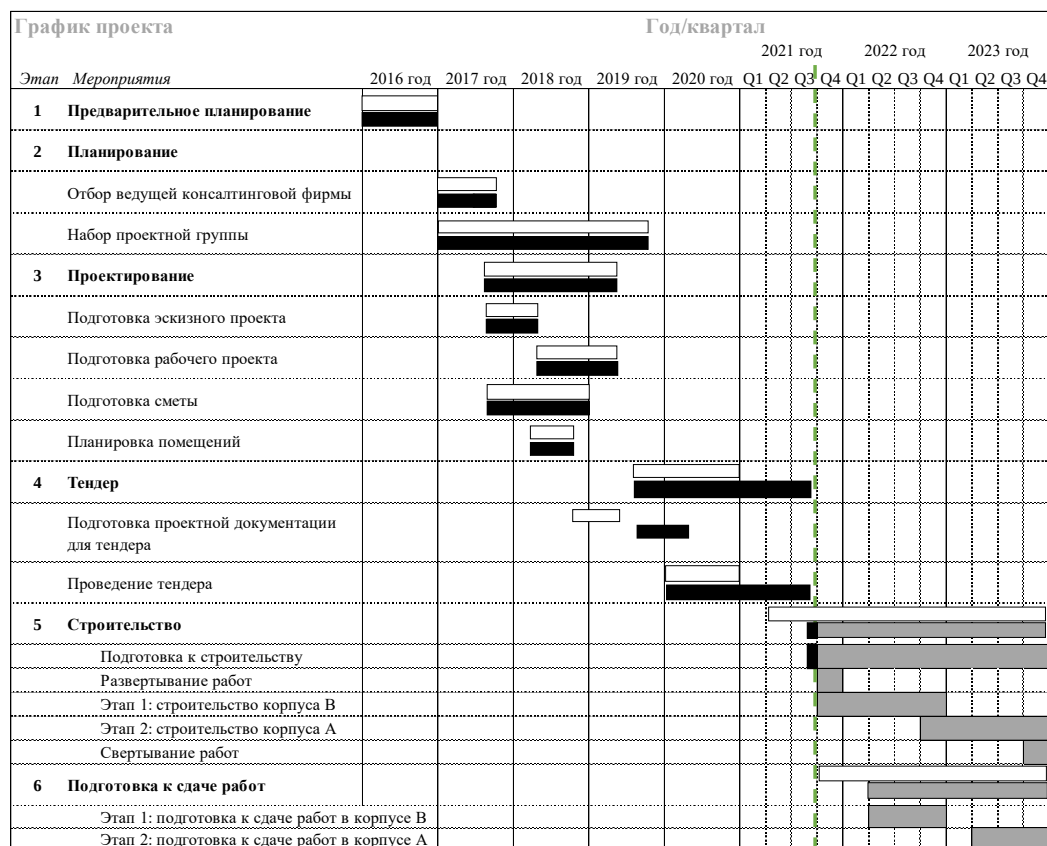
### График проекта

8. В докладе Генерального секретаря приводится подробная информация об общем графике проекта (A/76/313, пп. 65–66 и рисунок III). В нем сообщается, что после отмены первого тендера на общестроительные работы в 2019 году, были проведены повторные торги, по итогам которых ожидается присуждение контракта в третьем квартале 2021 года, а вскоре после этого начнутся основные строительные работы. Ожидается, что проект будет завершен в срок — к концу 2023 года, при этом ЭСКАТО продолжает следить за развитием ситуации в связи с пандемией COVID-19 и ее возможными последствиями для строительных работ. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что повторный тендер проводился исходя из пересмотренной многоэтапной стратегии закупок и что при этом были учтены извлеченные уроки, которые будут также изложены в интересах других строительных проектов Организации Объединенных Наций (см. п. 21 ниже).

9. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что, несмотря на шестимесячную задержку с подписанием контракта, ЭСКАТО ожидает, что строительные работы все же завершатся в декабре 2023 года, поскольку главный подрядчик согласился на график ускоренного строительства продолжительностью 27 месяцев, а именно: а) 2 месяца на подготовку к строительству; б) 24 месяца на строительство; с) 1 месяц на свертывание работ. Кроме того, Комитет был проинформирован о том, что график ускоренного строительства стал возможен также потому, что ЭСКАТО предложила предоставить подрядчику один корпус здания Секретариата целиком для содействия бесперебойной работе. В ответ на запрос Комитет был проинформирован также о том, что подготовка к строительству с выбранным участником торгов началась 23 сентября 2021 года, строительные работы должны начаться через 60 календарных дней после этой даты, т. е. в четвертом квартале 2021 года, а подготовка к сдаче первого этапа строительства начнется во втором квартале 2022 года. **Консультативный комитет принимает к сведению принятые меры, в том числе график ускоренного строительства, и надеется, что будут приложены все необходимые усилия для своевременного завершения проекта к 31 декабря 2023 года.**

10. В ответ на запрос Консультативный комитет получил обновленный график проекта по состоянию на 30 сентября 2021 года (см. таблицу 2).

Таблица 2

**График проекта по состоянию на 30 сентября 2021 года**

□ График проекта, указанный в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/75/235)

■ Ход проекта на 30 сентября 2021 года

■ Текущий/запланированный график в период с 30 сентября 2021 года

30 сентября  
2021 года

11. Консультативный комитет отмечает, что график проекта вновь представлен в виде диаграммы Ганта — общепринятого инструмента, применяемого группами по управлению проектами. Вместе с тем Комитет отмечает необходимость представить государствам-членам более подробную информацию о графике проекта со сводной сравнительной информацией, в частности с указанием точного месяца начала и окончания того или иного этапа, а также с объяснениями и обоснованиями в тех случаях, когда график не соблюдается. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять в будущих докладах о ходе проекта, а также в докладах о ходе других строительных проектов Организации Объединенных Наций в целях стандартизации формата отчетности график проекта как в виде диаграммы Ганта, так и в виде таблицы с указанием дат отдельных этапов и подэтапов и пояснениями любых отклонений от графика и другой соответствующей информацией.**

### **Планирование и проектирование**

12. В докладе Генерального секретаря приводится информация о планировании и проектировании (A/76/313, пп. 51–64). Генеральный секретарь сообщает, что разработка плана внутренних ремонтных работ и проекта будущего рабочего пространства была завершена в 2019 году, однако из-за пандемии COVID-19, а именно связанных с ней рисков для здоровья пользователей служебных помещений, предыдущие проектные предположения потребуются скорректировать до начала внутренних ремонтных работ. Он также сообщает, что серьезных изменений в объеме работ по проекту не ожидается, однако потребуются внести изменения в конфигурацию внутренних помещений, в основном в виде перепланировки мебельных систем и неструктурных элементов интерьера, чтобы обеспечить соответствие нормам охраны здоровья и безопасности в связи с COVID-19. Кроме того, не ожидается, что какие-либо будущие изменения приведут к увеличению расходов.

13. Что касается пробной схемы гибкого использования рабочих мест, то Генеральный секретарь указывает, что из расчета 30-процентной занятости помещений с гибким использованием рабочих мест для 328 сотрудников из девяти отделов ЭСКАТО будут выделены дополнительные подменные помещения площадью примерно 1200 квадратных метров с эргономичной мебелью. Ожидалось, что подменные помещения будут полностью заняты к сентябрю 2021 года. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что, помимо строительства здания с подменными помещениями, ЭСКАТО уже завершила перепланировку десяти этажей, выделенных в корпусе А здания Секретариата под подменные помещения для примерно 15 арендаторов из числа структур Организации Объединенных Наций. Кроме того, под временные подменные помещения для сотрудников ЭСКАТО были переоборудованы еще пять объектов на территории комплекса. **Консультативный комитет рассчитывает на то, что в следующем докладе о ходе проекта будет представлена обновленная информация об эксперименте по гибкому использованию рабочих мест.**

## Управление рисками

14. Первый количественный анализ рисков (моделирование методом Монте-Карло)<sup>2</sup> был проведен в 2018 году и показал, что при установленном в Организации Объединенных Наций контрольном показателе “P80” прогнозируемые расходы по данному проекту составят приблизительно 42,5 млн долл. США, т. е. превысят бюджет по проекту на 2,5 млн долл. США, причем уровень уверенности составляет 12 процентов (см. [A/74/317](#), п. 39)<sup>3</sup>. Четвертый, самый последний, анализ методом Монте-Карло, проведенный в мае 2021 года, показал, что уровень уверенности вырос до 27 процентов (с 20 процентов в 2020 году и 15 процентов в 2019 году). В докладе Генерального секретаря также указано, что, хотя уровень уверенности повысился, сохраняется неопределенность, связанная с динамикой обменного курса, дорогостоящими инфраструктурными системами и возможными последствиями пандемии COVID-19, но ожидается, что уровень уверенности вырастет еще больше после завершения переговоров по контракту на общестроительные работы и его подписания (см. [A/76/313](#), пп. 21–22 и рисунок I, и [A/75/7/Add.10](#), п. 9).

15. Консультативный Комитет надеется, что Генеральный секретарь будет внимательно отслеживать и снижать риски по проекту, чтобы обеспечить реализацию проекта в соответствии с объемом работ, бюджетом и сроками, утвержденными Генеральной Ассамблеей.

16. В докладе Генерального секретаря приводится информация об управлении рисками по проекту ([A/76/313](#), пп. 19–27). В таблице 3 приводится сопоставление пяти основных рисков по проекту ЭСКАТО.

Таблица 3

### Сопоставление пяти основных рисков по проекту в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

| <i>Предыдущие пять основных рисков<br/>(A/74/317, п. 44)</i>                                                                     | <i>Предыдущие пять основных рисков<br/>(A/75/235, п. 31)</i>       | <i>Текущие пять основных рисков<br/>(A/76/313, п. 27)</i>                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Мраморная облицовка/внешний фасад и остекление                                                                                | 1. Валютный риск                                                   | 1. Изменения по распоряжению заказчика: изменение проектных требований на позднем этапе и/или возможное увеличение объема работ |
| 2. Изменения по распоряжению заказчика (изменение проектных требований на позднем этапе и/или возможное увеличение объема работ) | 2. Наружные работы: мраморная облицовка/внешний фасад и остекление | 2. Несоблюдение запланированной даты начала строительных работ из-за COVID-19                                                   |

<sup>2</sup> Моделирование методом Монте-Карло представляет собой метод статистического анализа, призванный обеспечить лучшее понимание воздействия рисков на тот или иной проект путем использования ряда показателей, варьирующихся в пределах от минимального до максимального значения в зависимости от сроков и сметы расходов по этапам и компонентам, на основе компьютерного моделирования с разбором нескольких произвольно выбранных сценариев проекта (см. [A/74/7/Add.11](#), п. 9 (сноска)).

<sup>3</sup> Контрольный показатель “P80” представляет собой целевой уровень уверенности в том, что расходы по проекту не превысят 80 процентов от общей стоимости.



| <i>Предыдущие пять основных рисков<br/>(A/74/317, п. 44)</i> | <i>Предыдущие пять основных рисков<br/>(A/75/235, п. 31)</i>                                                                    | <i>Текущие пять основных рисков<br/>(A/76/313, п. 27)</i> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3. Переоборудование служебных помещений                      | 3. Изменения по распоряжению заказчика: изменение проектных требований на позднем этапе и/или возможное увеличение объема работ | 3. Валютный риск                                          |
| 4. Структурные недостатки                                    | 4. Электромонтажные и санитарно-технические работы                                                                              | 4. Электромонтажные и санитарно-технические работы        |
| 5. Электрическая распределительная система                   | 5. Несоблюдение запланированной даты начала строительных работ из-за COVID-19                                                   | 5. Управление проектом                                    |

17. **Консультативный комитет просит Генерального секретаря представлять в дальнейших докладах о ходе проекта обновленные версии вышеприведенной таблицы 3 с сопоставлением пяти основных рисков по проекту ЭСКАТО вместе с объяснением последних изменений. Комитет надеется, что в будущих докладах о ходе других строительных проектов Организации Объединенных Наций также будут содержаться подобные стандартизованные таблицы.**

18. Что касается риска номер один (изменения по распоряжению заказчика: изменение проектных требований на позднем этапе и/или возможное увеличение объема работ), то в ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что под заказчиком здесь подразумеваются ЭСКАТО и ее арендаторы и что, поскольку в комплексе ЭСКАТО в качестве долгосрочных арендаторов размещаются более 26 учреждений, фондов и программ, есть риск того, что требования клиентов могут измениться. Кроме того, Комитет был проинформирован о том, что проектная группа не контролирует различные изменения в управлении и бюджете, инициируемые арендаторами: например, арендаторы могут не подписать окончательные планы рабочих помещений для своевременного начала внутренних ремонтных работ или могут потребовать других изменений на более поздней стадии проекта. **Консультативный комитет считает, что необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы снизить риск изменений по распоряжению заказчика, и что, в частности, все дополнительные расходы по проекту, которые возникают в результате изменений по распоряжению заказчика, вносимых на позднем этапе, и могут привести к претензиям, должен нести соответствующий арендатор, а не ЭСКАТО. В связи с этим Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря в следующих докладах о ходе проекта сообщать о формализованных механизмах внесения изменений арендаторами на позднем этапе, включая финансовую отчетность.**

19. Что касается риска номер три (валютный риск), то, как указано в пункте 27 с) доклада Генерального секретаря, из-за укрепления курса тайского бата расходы на основные строительные работы увеличились примерно на 2 млн долл. США. В целях снижения этого риска группа по проекту включила в запрос о представлении предложений на получение генерального подряда требование к подрядчику закупать строительные материалы по фиксированной цене с



предоплатой и складировать их в безопасном месте, отметив, что изменения рыночных цен неподвластны группе и Организации Объединенных Наций. Кроме того, группа по проекту вместе с генеральным подрядчиком и группой по закупкам занимается подготовкой предложений по оптимизации стоимости исполнения проекта, чтобы компенсировать часть перерасхода, возникшего в результате повышения обменного курса. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован, что с учетом нестабильности курса тайского бата, который в последние девять месяцев стал снижаться после пяти лет укрепления, пока рано говорить о том, превысит ли общая стоимость проекта утвержденную максимальную стоимость, составляющую приблизительно 40 млн долл. США. **Консультативный комитет надеется, что усилия по снижению валютного риска будут продолжены и что подробная информация об этом будет включаться во все доклады о ходе проекта.**

#### **Удаление опасных материалов**

20. Как указано в докладе Генерального секретаря, одной из основных целей проекта является безопасное удаление опасных материалов, в том числе асбеста. С этой целью ЭСКАТО наняла для оказания профессиональных услуг местного эксперта, который обладает необходимыми знаниями местных условий труда и имеет международную сертификацию, для консультирования по вопросам выявления асбеста, наличие которого было установлено в ходе второго обследования опасных материалов, и взятия проб на него и его удаления. (там же, пп. 36 и 49–50). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что удаление опасных материалов предусматривается в качестве одной из главных задач в течение всего двухлетнего периода строительства. **Консультативный комитет надеется, что в следующих докладах о ходе проекта будут содержаться подробные сведения о ходе работ по удалению опасных материалов.**

#### **Закупки и использование местных материалов и привлечение местных специалистов**

21. В докладе Генерального секретаря содержится подробная информация о закупках и использовании местных материалов и привлечении местных специалистов (там же, пп. 35–50). В докладе Генерального секретаря сообщается о дальнейших усилиях по использованию местных материальных и людских ресурсов в проекте, в том числе о выборе местного подрядчика для удаления опасных материалов и найме местной консалтинговой фирмы для содействия проектной группе в проведении тендера на общестроительные работы. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что с целью привлечь более широкий круг участников рынка, в том числе малые и местные компании, в рамках процесса совместного запроса ЭСКАТО и Экономической комиссии для Африки предложений на поставку офисной мебели запросы были разделены на три категории: а) основные рабочие кресла, б) офисная мебель и с) мягкая мебель. Кроме того, ЭСКАТО и группа по проекту поддерживают тесный контакт с Советом инженеров Таиланда и обращаются к экспертам Совета за консультациями по вопросам строительных норм, правил и процедур, охраны труда и техники безопасности и практики управления строительством в местных условиях. **Комитет вновь подчеркивает важность использования материалов местного происхождения и производства, а также привлечения местных рабочих и специалистов и ожидает обновленной информации по этому вопросу в будущих докладах о ходе проекта.**

### **Стратегия обеспечения энергоэффективности и связанная с этим экономия средств**

22. Генеральный секретарь сообщает, что после установки новой механической и электрической системы и полной замены фасада ожидается повышение энергоэффективности на 16–18 процентов и сокращение затрат на долгосрочное обслуживание (там же, п. 8 е)). Консультативный комитет напоминает, что, например, в докладах о ходе проекта по реконструкции Северного здания Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) представлена подробная информация по этому вопросу, и подчеркивает, что энергоэффективность при строительстве и эксплуатации зданий является принципом, применяемым независимо от географического положения. Комитет подчеркивает, что нет никаких оперативных препятствий, которые мешали бы применению соответствующего опыта, полученного в ходе проекта ЭКЛАК и других строительных проектов Организации Объединенных Наций, включая, в соответствующих случаях, применение пассивных и активных методов достижения энергоэффективности, выработку электроэнергии с помощью фотоэлектрических элементов и очистку сточных вод, для достижения нулевого уровня выбросов, когда общий объем используемой энергии не превышает объема возобновляемой энергии, вырабатываемой на объекте (см. также [A/75/7/Add.10](#), пп. 17 и 18). **Консультативный комитет выражает обеспокоенность тем, что, несмотря на неоднократные просьбы к ЭСКАТО представить подробную информацию о стратегии энергоэффективности и соответствующей экономии затрат по проекту, в докладах ЭСКАТО о ходе проекта эта информация представлена не была. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить в своих следующих докладах о ходе проекта эту информацию, а также изложить уроки, извлеченные из других строительных проектов.**

## **III. Текущие и прогнозируемые расходы по проекту**

23. В докладе Генерального секретаря приводится подробная информация о текущих и прогнозируемых расходах по проекту, а также о сметных поступлениях от аренды помещений ([A/76/313](#), пп. 67–73 и приложение). Проект по ремонту комплекса ЭСКАТО по-прежнему проводится по специальному многолетнему счету незавершенного строительства, утвержденному Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [71/272](#) А, в силу чего срок предоставления финансовых средств не истекает в конце финансового периода, а после завершения проекта будет необходимо представить отчет о расходах, причем все неизрасходованные суммы подлежат возврату государствам-членам.

24. Генеральный секретарь сообщает, что общая стоимость проекта осталась без изменений — 40 019 000 долл. США. На 31 июля 2021 года прогнозируемый неизрасходованный остаток составил 5 215 000 долларов США, главным образом из-за задержек с началом основных строительных работ, которое теперь перенесено на третий квартал 2021 года. Чистые потребности в финансировании на 2022 год составляют 6 965 200 долл. США и складываются из прогнозируемых расходов в размере 12 180 200 долл. США и вышеуказанного прогнозируемого неизрасходованного остатка средств за 2021 год. Прогнозируемые расходы включают:

а) 934 300 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» для дальнейшего финансирования имеющихся должностей в группе по проекту (1 С-5, 1 С-4, 1 должность национального сотрудника-специалиста, 4 должности местного разряда и 1 должность

С-4 в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, финансируемая на 50 процентов), включая две должности местного разряда, утвержденные в 2019 году, но не заполненные в 2020 году из-за задержек с началом строительных работ;

б) 11 245 900 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт» для финансирования основных строительных работ, включая закупку мебели и оборудования, оплату услуг специалистов, резерв на случай изменения цен и резерв на покрытие непредвиденных расходов.

25. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация о ежемесячных расходах с 2017 по 2021 год, прогнозируемых расходах с сентября 2021 года по 2022 год и прогнозируемых расходах с 1 октября по 31 декабря 2021 года, а также смета расходов с момента начала проекта с указанием отклонений и пояснениями (см. приложения I–III к настоящему докладу). **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря включать обновленные варианты таких таблиц в доклады о ходе проекта ЭСКАТО, а также в доклады о ходе других строительных проектов Организации Объединенных Наций в целях стандартизации формата отчетности.**

#### **Непредвиденные расходы**

26. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что резерв на непредвиденные расходы в размере не менее 10 процентов от стоимости строительства считается отраслевым стандартом на этапах от завершения проектирования до подписания контракта и что в дальнейшем, в зависимости от сложности и объема работ, он будет уменьшаться. Комитет был проинформирован также о том, что резерв ЭСКАТО на непредвиденные расходы в настоящее время составляет около 7 процентов от стоимости строительства. Кроме того, Комитет был проинформирован о том, что из общей суммы резерва в 3 194 500 долл. США на сегодня израсходовано 1 679 000 долл. США (см. таблицу 4).

#### Таблица 4

#### **Проект повышения сейсмостойкости зданий Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана: текущие и прогнозируемые расходы из резерва на покрытие непредвиденных расходов**

(В долл. США)

| <b>Общая сумма резерва на покрытие непредвиденных расходов</b>                 | <b>3 194 500</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Исследование по оценке сейсмостойкости несущих элементов конструкции, 2019 год | 22 800           |
| Покрытие нехватки средств по бюджету на управление проектом, 2020 год          | 192 200          |
| Покрытие нехватки средств по бюджету на управление проектом, 2021 год          | 6 600            |
| Покрытие нехватки средств по бюджету на управление проектом, 2022 год          | 309 400          |
| Покрытие нехватки средств для оплаты услуг специалистов, 2021–2023 годы        | 1 148 000        |
| <b>Остаток резерва</b>                                                         | <b>1 515 500</b> |

#### **Поступления от сдачи помещений в аренду**

27. Генеральный секретарь отмечает, что годовые ставки аренды на 2020–2021 годы по-прежнему составляют 264 долл. США за м<sup>2</sup> (без изменений по сравнению с предыдущим периодом) для учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций и 288 долл. США за м<sup>2</sup> (ранее 279,60 долларов США за м<sup>2</sup>) для коммерческих арендаторов и что в настоящее время проводится оценка ставок аренды на период 2024–2025 годов и последующие годы. Он также сообщает, что, после того как будут завершены строительные работы, ставки на 2024–2025 годы будут, исходя из предварительного отчета по итогам обследования ставок арендной платы, установлены на уровне соответственно 288 долл. США за м<sup>2</sup> и 312 долл. США за м<sup>2</sup>. Кроме того, прогнозируемый годовой доход от аренды, в том числе аренды подменных помещений, вырастет с 3 890 616 долл. США в 2021 году до 4 974 360 долл. США в 2025 году. **Консультативный комитет надеется, что в следующих докладах о ходе проекта будут содержаться обновленные сведения о долговременных последствиях пандемии COVID-19 для поступлений от аренды и обновленные сведения о пересмотре ставок арендной платы, в том числе о прогнозируемом повышении эффективности использования помещений и эффективности затрат.**

#### **IV. Заключение**

28. Меры, которые Генеральный секретарь рекомендует принять Генеральной Ассамблее, указаны в пункте 75 его доклада. **С учетом изложенных выше рекомендаций и замечаний Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:**

- a) **принять доклад к сведению;**
- b) **ассигновать на деятельность по проекту в 2022 году сумму в размере 6 965 200 долл. США, в том числе 940 900 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и подлежащую покрытию из резервного фонда сумму в 6 024 300 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» предлагаемого бюджета по программам на 2022 год.**

## Приложение I

### Прогнозируемые расходы по проекту повышения сейсмостойкости и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке, сентябрь 2021 года — декабрь 2022 года

(В тыс. долл. США)

|                                                                                      | сентябрь<br>2021 года | октябрь<br>2021 года | ноябрь<br>2021 года | декабрь<br>2021 года | Итого,<br>2021 год | январь<br>2022 года | февраль<br>2022 года | март<br>2022 года | апрель<br>2022 года | май<br>2022 года | июнь<br>2022 года | июль<br>2022 года | август<br>2022 года | сентябрь<br>2022 года | октябрь<br>2022 года | ноябрь<br>2022 года | декабрь<br>2022 года | Итого,<br>2022 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Раздел 33</b>                                                                     |                       |                      |                     |                      |                    |                     |                      |                   |                     |                  |                   |                   |                     |                       |                      |                     |                      |                    |
| <b>«Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»</b> |                       |                      |                     |                      |                    |                     |                      |                   |                     |                  |                   |                   |                     |                       |                      |                     |                      |                    |
| 1. Расходы на строительство                                                          | 118                   | 150                  | 2 641               | 150                  | 3 059              | 224                 | 673                  | 898               | 898                 | 1 347            | 673               | 673               | 1 571               | 1 347                 | 1 122                | 898                 | 449                  | 10 773             |
| 2. Услуги специалистов (консультантов)                                               | 66                    | 197                  | 197                 | 197                  | 656                | 95                  | 95                   | 48                | 48                  | 63               | 48                | 63                | 48                  | 63                    | 63                   | 63                  | 63                   | 761                |
| 3. Расходы, обусловленные изменением цен                                             | 5                     | 6                    | 106                 | 6                    | 122                | 126                 | 126                  | 126               | 126                 | 126              | 126               | 126               | 126                 | 126                   | 126                  | 126                 | 126                  | 1 516              |
| 4. Непредвиденные расходы                                                            | 18                    | 35                   | 284                 | 35                   | 371                | 41                  | 41                   | 41                | 41                  | 41               | 41                | 41                | 41                  | 41                    | 41                   | 41                  | 41                   | 490                |
| <b>Итого, раздел 33</b>                                                              | <b>207</b>            | <b>387</b>           | <b>3 227</b>        | <b>387</b>           | <b>4 208</b>       | <b>486</b>          | <b>935</b>           | <b>1 113</b>      | <b>1 113</b>        | <b>1 578</b>     | <b>888</b>        | <b>904</b>        | <b>1 786</b>        | <b>1 578</b>          | <b>1 353</b>         | <b>1 129</b>        | <b>680</b>           | <b>13 540</b>      |

|                                                                                                                                       | сентябрь<br>2021 года | октябрь<br>2021 года | ноябрь<br>2021 года | декабрь<br>2021 года | Итого,<br>2021 год | январь<br>2022 года | февраль<br>2022 года | март<br>2022 года | апрель<br>2022 года | май<br>2022 года | июнь<br>2022 года | июль<br>2022 года | август<br>2022 года | сентябрь<br>2022 года | октябрь<br>2022 года | ноябрь<br>2022 года | декабрь<br>2022 года | Итого,<br>2022 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Раздел 19</b><br><b>«Экономиче-<br/>ское и соци-<br/>альное разви-<br/>тие в Азиат-<br/>ско-Тихооке-<br/>анском реги-<br/>оне»</b> |                       |                      |                     |                      |                    |                     |                      |                   |                     |                  |                   |                   |                     |                       |                      |                     |                      |                    |
| 5. Управление проектом                                                                                                                | 112                   | 112                  | 112                 | 112                  | 446                | 78                  | 78                   | 78                | 78                  | 78               | 78                | 78                | 78                  | 78                    | 78                   | 78                  | 78                   | 934                |
| <b>Итого, раз-<br/>дел 19</b>                                                                                                         | <b>112</b>            | <b>112</b>           | <b>112</b>          | <b>112</b>           | <b>446</b>         | <b>78</b>           | <b>78</b>            | <b>78</b>         | <b>78</b>           | <b>78</b>        | <b>78</b>         | <b>78</b>         | <b>78</b>           | <b>78</b>             | <b>78</b>            | <b>78</b>           | <b>78</b>            | <b>934</b>         |
| <b>Всего</b>                                                                                                                          | <b>318</b>            | <b>499</b>           | <b>3 338</b>        | <b>499</b>           | <b>4 655</b>       | <b>564</b>          | <b>1 013</b>         | <b>1 191</b>      | <b>1 191</b>        | <b>1 655</b>     | <b>966</b>        | <b>981</b>        | <b>1 864</b>        | <b>1 655</b>          | <b>1 430</b>         | <b>1 206</b>        | <b>757</b>           | <b>14 475</b>      |

*Примечания:*

1. Расходы на строительство в оставшейся части 2021 года меньше, чем прогнозировалось на момент составления доклада, из-за задержки в заключении контракта.
2. Расходы на строительство в 2022 году больше, чем прогнозировалось на момент составления доклада, из-за сдвига сроков начала строительства и ускорения темпов строительства.

## Приложение II

### Смета расходов по проекту повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке, 2017–2023 годы: прочие услуги

(В тыс. долл. США)

| Доклад                                                                                    | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего                                                       |                                   | Разница               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                           | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | Общая сумма, указанная в рассматриваемом докладе (A/76/313) | Общая сумма, указанная в A/75/235 | (A/76/313)-(A/75/235) |
| <b>2.5 Прочие услуги</b>                                                                  | 126      | 57       | 44       | 291      | 663      | 689      | 401      | 2 270                                                       | 1 069                             | 1 201                 |
| 2.5.1 Выполняемая третьей стороной экспертная оценка ведущей консалтинговой фирмы         |          | 55       | —        | —        | —        | —        | —        | 55                                                          | 55                                | —                     |
| 2.5.2 Технические услуги                                                                  |          | —        | 42       | 291      | 663      | 689      | 401      | 2 085                                                       | 875                               | 1 210                 |
| Опасные материалы                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Обследование фасада/экстренное тестирование на асбестосодержащие материалы в фасаде       |          |          |          | 12       | 9        |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Эксперт-консультант                                                                       |          |          |          |          | 13       | 13       |          |                                                             |                                   |                       |
| Разработка схемы использования подменных помещений                                        |          |          | 25       | 17       |          |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Независимый местный эксперт                                                               |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Обследование рынка                                                                        |          |          |          | 18       |          |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Обследование стоимости                                                                    |          |          |          | 30       |          |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Структурные технические услуги/поддержка запроса предложений                              |          |          |          | 7        | 19       | 35       | 10       |                                                             |                                   |                       |
| Архитектор                                                                                |          |          | 18       | 30       | 32       | 30       |          |                                                             |                                   |                       |
| Консультант по будущему использованию рабочего пространства                               |          |          |          |          | 13       | 13       |          |                                                             |                                   |                       |
| Консультант по расходам                                                                   |          |          |          | 56       | 46       |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Запасной вариант                                                                          |          |          |          | 37       |          |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Проверка/обновление комплекта документов для запроса предложений; тендерное сопровождение |          |          |          | 84       | 79       |          |          |                                                             |                                   |                       |
| Сотрудник ООН по проверке добросовестности в ходе многоэтапного конкурсного диалога       |          |          |          |          | 9        |          |          |                                                             |                                   |                       |



|                                                   | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего                                                                     |                                              | Разница                   |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                   |          |          |          |          |          |          |          | Общая сумма,<br>указанная в<br>рассматривае-<br>мом докладе<br>(A/76/313) | Общая<br>сумма, ука-<br>занная в<br>A/75/235 | (A/76/313)-<br>(A/75/235) |
| Доклад                                            | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 |                                                                           |                                              |                           |
| Административное сопровождение строительных работ |          |          |          |          |          |          |          |                                                                           |                                              |                           |
| Категория 1                                       |          |          |          |          | 174      | 508      | 391      |                                                                           |                                              |                           |
| Категория 2                                       |          |          |          |          | 270      | 90       | —        |                                                                           |                                              |                           |
| Категория 3                                       |          |          |          |          | —        | —        | —        |                                                                           |                                              |                           |

Приложение III

Подробная смета расходов по проекту повышения сейсмостойкости зданий
 и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической
 и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке, 2017–2023 годы

(В тыс. долл. США)

| Доклад                                                                                            | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего                                                       |                                   | Разница                   |                                                       | Примечание |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | Общая сумма,<br>указанная в рас-<br>сматриваемом<br>докладе | Общая<br>сумма,<br>указанная<br>в | (A/76/313)-<br>(A/75/235) | Первоначаль-<br>ная смета рас-<br>ходов<br>(A/72/338) |            | Разница<br>(A/75/235)-<br>(A/72/338)                         |
|                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          | (A/76/313)                                                  | A/75/235                          |                           |                                                       |            |                                                              |
|                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                   |                           |                                                       |            |                                                              |
| Раздел 33 «Строительство, пере-<br>стройка, переоборудование и капи-<br>тальный ремонт помещений» |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                   |                           |                                                       |            |                                                              |
| 1. Расходы на строительство                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                   |                           |                                                       |            |                                                              |
| 1.1 Стоимость строительства                                                                       | —        | —        | —        | —        | 4 956    | 7 858    | 7 540    | 20 354                                                      | 20 358                            | (4)                       | 18 285                                                | 2 073      | Строитель-<br>ство под-<br>менных по-<br>мещений             |
| 1.2 Расходы на подменные помеще-<br>ния                                                           | —        | —        | 1 536    | 1 000    | 505      | 620      | 611      | 4 272                                                       | 4 268                             | 4                         | 6 341                                                 | (2 073)    | Подменные<br>помещения<br>вне ком-<br>плекса не<br>строились |
| 1.5 Система обеспечения физической<br>безопасности                                                | —        |          |          | 13       | 177      |          |          | 190                                                         | 190                               | —                         | 190                                                   | —          |                                                              |
| Итого, расходы на строитель-<br>ство                                                              | —        | —        | 1 536    | 1 013    | 5 638    | 8 478    | 8 151    | 24 816                                                      | 24 816                            | —                         | 24 816                                                | —          |                                                              |
| 2. Услуги специалистов (консультантов)                                                            |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                   |                           |                                                       |            |                                                              |
| 2.1 Услуги ведущей консалтинговой<br>компании                                                     | 202      | 1 366    | 197      | —        |          |          |          | 1 766                                                       | 1 796                             | (30)                      | 1 890                                                 | (95)       |                                                              |
| 2.2 Разработка проекта повышения<br>сейсмостойкости                                               | 134      | —        | —        | —        | —        | —        | —        | 134                                                         | 134                               | —                         | 98                                                    | 36         |                                                              |
| 2.3 Проектирование служебных по-<br>мещений                                                       |          |          |          |          |          |          |          | —                                                           |                                   | —                         | —                                                     | —          |                                                              |

| Доклад                                                                                          | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего    |                                                             | Разница                                        |                       | Первоначальная смета расходов (A/72/338) | Разница (A/75/235)-(A/72/338)                                                | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | Общая сумма, указанная в рассматриваемом докладе (A/76/313) | Общая сумма, указанная в (A/75/235) (A/75/235) | (A/76/313)-(A/75/235) |                                          |                                                                              |            |
|                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |                                                             |                                                |                       |                                          |                                                                              |            |
| 2.4 Управление рисками                                                                          | –        | 8        | 55       | 45       | 60       | 72       | –        | 241      | 241                                                         | –                                              | 233                   | 7                                        |                                                                              |            |
| 2.5 Прочие услуги                                                                               | 126      | 57       | 44       | 291      | 663      | 689      | 401      | 2 270    | 1 069                                                       | 1 201                                          | 149                   | 921                                      |                                                                              |            |
| Итого, услуги специалистов (консультантов)                                                      | 462      | 1 431    | 296      | 336      | 723      | 761      | 401      | 4 411    | 3 240                                                       | 1 171                                          | 2 371                 | 869                                      |                                                                              |            |
| 3. Расходы, обусловленные изменением цен                                                        | –        | –        | –        | –        | 704      | 1 516    | 1 669    | 3 889    | 3 889                                                       | –                                              | 4 760                 | (871)                                    | Скорректированы и проведены по статье расходов на оплату услуг консультантов |            |
| 4. Непредвиденные расходы                                                                       | –        | –        | 23       | –        | 706      | 490      | 296      | 1 515    | 3 002                                                       | (1 487)                                        | 3 195                 | (192)                                    | Увеличение расходов на управление проектом                                   |            |
| Итого, раздел 33                                                                                | 462      | 1 431    | 1 855    | 1 349    | 7 771    | 11 246   | 10 517   | 34 631   | 34 947                                                      | (316)                                          | 35 141                | (193)                                    |                                                                              |            |
| 5. Управление проектом                                                                          | 514      | 749      | 930      | 1 009    | 903      | 934      | 348      | 5 388    | 5 072                                                       | 316                                            | 4 879                 | 193                                      |                                                                              |            |
| 5.1 Специальная группа по управлению проектом и вспомогательному обслуживанию                   | 475      | 614      | 783      | 884      | 903      | 795      | 348      | 4 802    | 4 612                                                       | 189                                            | 4 458                 | 154                                      |                                                                              |            |
| 5.2 Специальный координатор в Центральных учреждениях (должность финансируется на 50 процентов) | 14       | 136      | 148      | 125      | –        | 125      | –        | 548      | 421                                                         | 127                                            | 395                   | 26                                       |                                                                              |            |

| Доклад                                    | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего                                                       |                                   | Разница                   |                                                    | Примечание |                                                                             |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                           | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | A/76/313 | Общая сумма,<br>указанная в рас-<br>сматриваемом<br>докладе | Общая<br>сумма,<br>указанная<br>в | (A/76/313)-<br>(A/75/235) | Первоначаль-<br>ная смета рас-<br>ходов (A/72/338) |            |                                                                             |
|                                           |          |          |          |          |          |          |          | (A/76/313)                                                  | A/75/235                          |                           |                                                    |            |                                                                             |
| 5.3 Поездки группы по управлению проектом | 25       |          | —        | —        | —        | 14       | —        | 38                                                          | 38                                | —                         | 25                                                 | 13         |                                                                             |
| Итого, раздел 19                          | 514      | 749      | 930      | 1 009    | 903      | 934      | 348      | 5 388                                                       | 5 072                             | 316                       | 4 879                                              | 193        | Нехватка средств на управление проектом, предусмотренных в бюджете A/75/235 |
| Всего                                     | 976      | 2 180    | 2 785    | 2 359    | 8 674    | 12 180   | 10 865   | 40 019                                                      | 40 019                            | —                         | 40 019                                             | —          |                                                                             |
