



大会

Distr.: General
25 April 2001
Chinese
Original: English

第五十五届会议

议程项目 117

2000-2001 两年期方案预算

发展帐户出资的项目的执行情况

秘书长的报告

摘要

大会在第 53/220 A 号决议、第 53/220 B 号决议和第 54/249 号决议（第四部分）核准属于发展帐户第一档和第二档范围内的 23 个项目。大会在第 53/220 A 号决议、第 53/220 B 号决议和第 54/15 号决议决定经常审查这些项目的执行情况，并请秘书长按照有关条例和规则向大会提出报告。本报告是按这项要求编写的。

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-3	3
二. 管理发展帐户的框架	4-18	3
三. 项目执行情况进度报告	19-279	5
四. 改善进展报告	280-291	23
五. 监督机构的建议	292-293	
附件		
一. 由发展帐户第一和第二档出资的项目名单		25
二. 1998-1999 年两年期方案预算第 34 款(发展帐户)出资的项目(大会第 52/220 决议 A 和 B 号)		26
三. 2000-2001 两年期方案预算第 33 款(发展帐户)出资的项目(A/C.5/54/37, 大会 第 54/249 号决议, 第四部分)		27

一. 导言

1. 发展帐户是联合国秘书长在其题为“革新联合国：改革方案”的报告(A/51/950和Add.1-7)所载一揽子改革措施的行动21中提议设立的。这个帐户的资源是秘书处响应秘书长关于精简行政工作的要求努力减少非方案费用和将之用于其他重点项目而筹得的。简化程序和手续、减少重复性行政工作、建立电子化的联合国和使秘书处各项职能现代化,便能腾出资源用于经济和社会部门的项目。

2. 自从发展帐户设立后,核准了23个项目,共计26 130 000美元。详情如下:

(a) 7个项目的经费已经在1998-1999两年期方案预算范围内提供。这些项目是秘书长在其关于使用发展红利的报告(A/53/374和Add.1)中提议的,并经大会1999年4月7日第53/220 A号决议和1999年6月8日第53/220 B号决议核准;

(b) 16个项目的经费已经在2000-2001两年期方案预算范围内提供。这些项目的提案载于秘书长在其关于由2000-2001两年期方案概算第33款“发展帐户”下拟议的资源出资的项目的报告(A/C.5/54/37),并在大会1999年12月23日第54/249号决议第四部分中提及。

3. 大会在第53/220 A号决议和第53/220 B号决议以及1999年10月29日第54/15号决议中决定经常审查这些项目的执行情况,并请秘书长按照有关条例和规则向大会提出报告。本报告是按这项要求编写的。

二. 管理发展帐户的框架

多年帐户

4. 根据大会第54/15号决议,发展帐户是在《联合国财务条例和细则》以及《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》框架内运作的。

5. 为了确保核定项目不断获得经费,大会在方案预算第33款“发展帐户”下拨出的款项转拨到补充性发展活动的特别帐户里。根据大会第54/15号决议,拨给发

展帐户的资金按多年项目处理,这样在两年期结束时拨给该帐户的任何款项结余将转入下一个两年期。

6. 根据大会为个别项目核准的数额,方案规划和预算司将款项分配给秘书处各有关处厅,以便执行这些项目。分配给设在总部的处厅的款项是通过综合管理信息系统(综管信息系统)拨出的,分配给总部以外办事处的款项是通过综管信息系统以硬通货拨出的。对每一个项目指定一个综管信息系统个别项目编号。每六个月,帐务司为各个补充发展活动特别帐户单独印发财务报表。

7. 发展帐户下承付的支出必须符合与联合国经常预算其他款次所适用的相同的程序和方式。没有核准用任何支助费用来支付行政支出。项目预算包括直接不断的维持费用,以确保实现预期的成果。

审查和核准

8. 发展帐户向秘书处经济和社会领域的方案提供所需的额外资金,以便在传统预算外资源大幅度减少时用于各项发展活动。发展帐户特意鼓励创新的技术合作活动,特别是那些支持使用信息和通信技术的活动,并鼓励发展中国家之间更多地进行技术合作。使用发展帐户,便能有系统地了解技术合作工作的范围和重点,统一各种执行方式,使经济和社会事务执行委员会的各个实体更加密切联系一起。

9. 发展帐户下的项目的审查和核准过程对于联合国经常预算来说是创新的。各个项目提案竞相遵守大会规定的标准,尽量提高效率来实现拟议的成绩。经济和社会事务执行委员会在选择过程和监测执行情况方面发挥集体的作用。鼓励共同设计和执行跨部门、区域、分区域和区域间项目。随后政府间过程对每一个项目提案进行审查,从而促进透明度和问责制。强调项目完成后活动的可持续性,使同当地团体和机构以及同捐助界的伙伴关系成为重要的执行考虑因素。

方案管理人员

10. 主管经济和社会事务副秘书长作为发展帐户的方案管理人员行事。他作为经济和社会事务执行委员

会的召集人，负责请经济和社会事务执行委员会各实体向新项目提出项目提案，以便：


(a) 审查这些项目提案是否符合标准和不超过下一个预算期间可供资助的总额；

(b) 编制一份短的项目清单，供执行委员会审议；

(c) 最后编定经选择的项目，供政府间过程审查，并按照联合国有关条例和规则，编写关于由发展帐户出资的项目执行情况的报告提交大会。

11. 方案管理人员还负责确保向政府间机构提出关于由发展帐户出资的项目执行情况的有效进度报告。下图说明与项目提案的编制、审查和核准有关的主要活动的流程。

发展帐户的项目的编制、审查和核准有关活动的流程

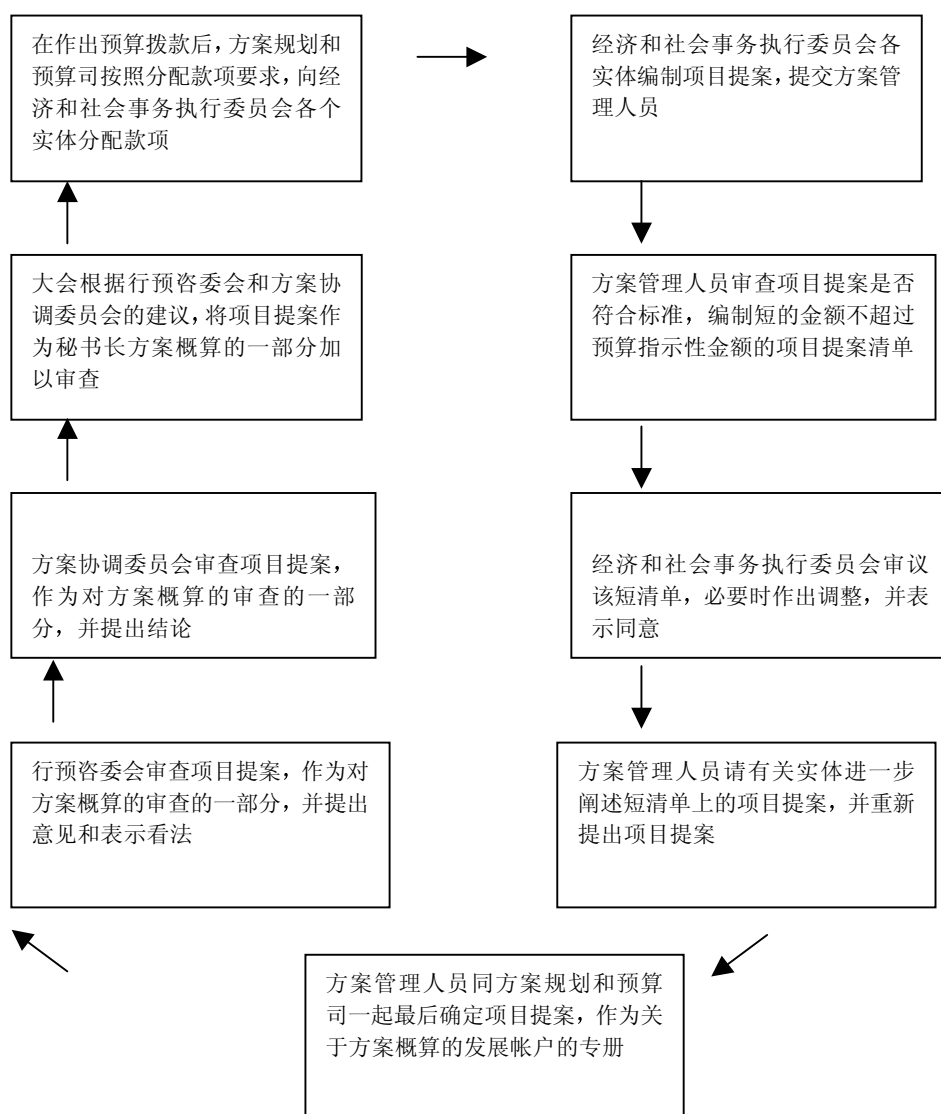

监测和执行情况报告

12. 每年向经济和社会事务执行委员会方案管理人员提出实质性进度报告两次。这些报告用来管理监督工作，并作为编制向大会提交的报告的基础。这些进度报告的目的是确保在拨款的使用方面具有透明度和良好的管理，提供资料说明项目符合其规定的结果情况，特别是说明产出交付情况和根据拟议预期成绩和既定标准评价发展影响。进度报告还反馈所吸取的经验教训。方案规划和预算司利用这些报告，按照《联合国财务条例和细则》以及《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》评价项目执行情况是否符合财政问责制。

13. 为了确保执行情况报告的一致性和可比较性和方便项目提案的编制工作以及随后的分配资金要求，方案管理人员印发了关于编制发展帐户出资的项目的提案、资金筹措和进度报告的执行指导方针 (www.un.org/esa/devaccount/guidelines.htm)。这些指导方针已经放在联合国内联网上，是统一经济和社会事务执行委员会各实体的发展帐户工作的重要工具。

14. 目前，各进度报告以电子方式（电子邮件）提交。预期综合监测和文件信息系统（监文信息系统）中的发展帐户方案执行工具完成后，将会在线实时（即当具体产出交付时）提交执行进度资料。

项目执行工作的协调

15. 个别项目执行工作的日常管理、财务责任和问责由指定负责该项目的经济和社会事务执行委员会实体各自的领导人承担。同时，所有项目都需要符合大会规定的标准，必须有不断的业绩监测和评价安排，并一贯地及时向有关政府间机构提交项目执行情况报告。这些任务是通过一个联络人框架、使用监文信息系统和发展帐户网站来实现的。

16. 经济和社会事务执行委员会每个有关实体为发展帐户指定联络人，他们通常是行政事务处主任、方案支助股主任或主任直属办公室的工作人员。这些联络人与发展帐户方案管理人员和方案规划和预算司

协调各方面联络活动，并编制和执行发展帐户出资的项目提案。由于经济和社会事务执行委员会各实体设在全世界各联合国中心，而且许多都在不同的时区，因此利用信息和通信技术进行协调。迄今为止这个办法行之有效。

17. 监文信息系统是联合国秘书处使用的在线方案管理工具。它的目的是作为一个管理工具，以便管理人员不断和全面地监测方案产出的执行情况，最近还进行方案规划。虽然关于发展帐户的部分已经是监文信息系统格式的一部分，目前还在设计某些方面的业绩管理，以满足自成一体的项目内与发展帐户的使用有关的规划、监测以及评价产出和影响的需要。

18. 2000年8月，方案管理人员在联合国内联网启动了发展帐户网站 (www.un.org/esa/devaccount/)。它的主要目的是向会员国和其他感兴趣的各方包括普通大众提供有关发展帐户及其使用情况的最新消息；提供一个信息工具以便协调经济和社会事务执行委员会各实体在这方面的工作；并把有关实质性方案和机构的网站和其他信息资源联系起来。该网站载列所有核定项目的清单和摘要，查阅有关政府间立法和会议文件以及执行指导方针。

三. 项目执行情况进度报告

98/99 A 促进电子商务（联合国贸易和发展会议）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

19. 该项目的目标是加强联合国贸易和发展会议（贸发会议）管理的全球贸易点网络。

20. 本项目属于 1998—2001 年中期计划 (A/53/6/Rev. 1) 方案 9(贸易和发展)的次级方案 9.4(促进发展和贸易效率的服务基础结构)的范围和优先事项。

预期成绩和指标

21. 项目的实施将导致：

(a) 消除发展中国家在参与电子商务方面的一些障碍, 增加利用有形网络、资源和技术的机会;

(b) 提高发展中国家和经济转型国家决策人员和谈判人员对电子商务的性质及有关电子商务问题的认识;

(c) 根据以下指标判断取得成绩的情况: 全球贸易点网络网站的点击次数; 有效地应用拟议的新电子软件; 对关于电子商务的性质及有关电子商务问题的了解程度的调查答复情况。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

建立并维持信息交流和政策分析框架

22. 一本重要的出版物《建立信任: 电子商务与发展》于 2000 年 2 月出版, 在 2000 年 2 月 12 日至 19 日于曼谷举行的联合国贸易和发展会议第十届会议上首次发行。该出版物的内容包括促进电子商务行动议程; 供拟于 2001 年在布鲁塞尔召开的第三次联合国最不发达国家问题会议讨论的关于促进电子商务的建议; 就中国以及安第斯共同体国家电子商务情况编写的研究报告; 关于在线支付现状的研究报告。

关于国际通用电子商务文书标准及商务惯例的影响的分析

23. 电子商务与旅游业问题专家会议 (2000 年 9 月) 提出的关于国家电子商务远景规划和政策的建议。

向各国政府提供政策问题方面的援助和咨询

24. 在尼日利亚召开的会议 (2000 年 10 月) 上, 向非洲各国财政部长提供了财政收入方面的咨询意见, 特别提及电子商务。

专用软件

25. 对一名联合国贸发会议的工作人员进行了关于全球贸易分析软件的培训。

计算机辅助培训班

26. 在开办培训班之前先将网站和硬拷贝材料翻译成法文和西班牙文。

2. 项目的效果和影响

27. 各种会议向政府清楚地表明, 忽视电子商务是要付出很高代价的, 而且这个问题应在贸发会议及其他会议上的政策讨论议程上占据突出的位置。

28. 研究表明, 电子商务对世界贸易产生了积极影响, 有必要缩小数字鸿沟。

29. 查明了促进发展中国家电子商务的重要政策战略。

30. 交流发展中国家的成功经验起到了鼓励其他发展中国家促进电子商务的作用。

3. 遵循发展帐户标准的情况

31. 正在发展人力和信息资源, 以建立国家一级的能力。

32. 发展中国家专家和顾问参与了项目的实施。

98/99 B 通过专门知识联网进行非洲经济和社会政策分析方面的能力建设 (非洲经济委员会)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

33. 该项目的目标是, 在非洲国家一级, 通过关于该区域发展的专门知识网络, 在经济和社会方面作出有更多事实根据的、基础更为广泛的决策。

34. 该项目属于中期计划方案 14 (非洲的经济和社会发展), 次级方案 14.1 (促进经济和社会政策分析) 的范围和优先事项。

预期成绩和指标

35. 项目的实施将导致:

(a) 与各研究中心和个人以及它们之间建立非洲发展专门知识数据库;

(b) 提高国家决策一级的分析能力和应用技巧;

(c) 按网络内电子通讯量、数据库/ 网站访客、交流访问和已经完成的研究的数目增加情况判断成绩;

(d) 在利用问卷调查了解从网络获得技能和知识的情况及这些技能和知识如何运用于政府资助的研究项目的情况的基础上作出评估。

B. 截至 2000 年底的进展情况

1. 产出

36. 该项目主要通过非洲发展论坛和非洲知识网络论坛来实施，这两个论坛共同组成了网络伙伴论坛。

非洲发展论坛

37. 非洲发展论坛于 1999 年开始实施该项目。每年选定非洲在全球发展问题方面面临的一项重大挑战作为项目主题。设计研究项目和建立网络项目，以便在国家、分区域及区域各级作出决策，最后举行年度会议。会议后继续进行后续行动和反馈。

38. 为 1999 年选定的问题是“全球化与信息时代”。这导致了一系列国家一级活动，包括拟定国家信息和通信基础设施计划和战略，创造有利的政策和规章环境，以在社会及经济部门成功地应用信息和通信技术，并使年轻人有更多的机会接触这些技术。在教育、卫生、企业及人力建设资源能力等领域都开始了针对各部门制定的信息和通信技术应用方案。计划在拟于 2001 年中在摩洛哥召开的论坛后国家和政府首脑会议上，将对论坛的目标和方案作出最高级别的承诺。

39. 为 2000 年选定的问题是人体免疫机能丧失病毒/ 后天免疫机能丧失 综合症（艾滋病毒/ 艾滋病）流行病与领导在解决这个问题上的作用。1500 多名代表参加了 2000 年 12 月在亚的斯亚贝巴举行的非洲发展论坛 2000 年会议。该项目为技术咨询委员会提供了支助，该委员会负责监督论坛的研究和分析产出，包括两个讲习班在内。非洲发展论坛 2000 年会议的正式成果是《非洲共识和行动计划：加强领导防治艾滋病毒/ 艾滋病》，其中包括各国政府、国际组织、民间社会和个人的承诺以及如何通过可监测的方案落实

这些承诺。计划于 2001 年 4 月在尼日利亚召开论坛后首脑会议。

非洲知识网络论坛

40. 非洲知识网络论坛的主要目标是为了满足非洲研究人员之间更多地分享知识的需要，以便更有效地解决各种公共政策问题，丰富教学课程、促进私营部门和民间社会、促进善政和非洲社会与经济一体化。在年度论坛会议的筹备工作讲习班上以及论坛会议上确定并审查了实务工作安排。信息及研究交流是通过电子方式不间断地进行的。

41. 已经确立了非洲知识网络论坛的业务计划，其中包括与利益有关者签订的关于论坛的组织网络的管理和操作方式的协议。

42. 委托编写了以下四个主题领域的政策文件：区域一体化；全球经济中的非洲；非洲与信息经济；两性别问题以及管理。通过研究产生的报告将为关于这些问题的讨论和会议提供重要的材料。“为非洲发展筹资”已经为 2000 年 11 月的非洲财政部长会议作出了贡献。非洲一体化问题年度报告（2000 年）将构成 2001 年非洲发展论坛的背景主题文件。

2. 项目的效果和影响

43. 对 1999 年非洲发展论坛的评价调查作出答复的人中，有 90% 赞扬论坛帮助其国家查明了适合国情的政策选择。

44. 97% 的答复者都明确地说他们将开展为论坛后续行动而制定的活动。

45. 该项目通过对 2000 年非洲发展论坛的贡献，提高了最高层对非洲防治艾滋病毒/ 艾滋病流行病的认识，并使他们作出承诺。

46. 交流了战胜艾滋病毒/ 艾滋病方面的最佳做法，并确定了今后努力方向。

47. 非洲知识网络论坛已经建立，并已开始向政策制定者提供在非洲生成的研究的基础上编写的政策文件及其他文件。

48. 发起了非洲年轻专业人员奖学金方案, 预计 2001 年将扩大该方案。

49. 吸引了访问学者为主要领域的研究和政策辩论提供意见。非洲发展论坛秘书处与世界银行之间的人员交流已经开始。

3. 遵循发展帐户标准的情况

50. 在建立网络和非洲内部合作方面取得重大进展, 使能力得到加强。

51. 所谈的问题和所用的方式都是为了促进区域进一步一体化而设计的。

98/99 D 国际及国家药物管制电脑和电信系统(联合国国际药物管制规划署)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

52. 该项目的目标是, 通过利用国际及国家药物管制电脑和电信系统(NDS)来加强参与国政府的能力, 以便监测和管理含有麻醉药品、精神药物和前体化学品的制剂的生产、制造、消费和储存。

53. 该项目属于中期计划方案 13(国际药物管制)的次级方案 13.4(减少供应、铲除非法作物和查禁非法药物贩运)的范围和优先事项。

预期成绩和指标

54. 将通过执行该项目逐步在参与国安装并有效地利用国际及国家药物管制电脑和电信系统(NDS)。

55. 将根据安装此电脑系统的国家数目以及通过主动征求反馈意见而了解到的系统得到使用的程度以及其有用性和有效性来判断成绩。

B. 截至 2000 年底的进展情况

1. 产出

56. 第三次用户小组会议(2000 年 11 月, 维也纳)一致核准了药物管制电脑电信系统, 认为这是一个综

合性的、成熟的使用极为简便的、可进行详细测试, 并有可能实施。

57. 已经建立起了安全的药物管制电脑电信系统网站, 药物管制电脑电信系统用户常来访问。

58. 选定了四个东非国家(埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国)作为该区域试用药物管制电脑电信系统的国家。

59. 为药物管制电脑电信系统提供基础数据库软件的 Oracle 公司为参与国提供了 100 份该软件的许可证, 还免费提供一年的支助该系统的服务。

60. 已在埃及、约旦和黎巴嫩安装了药物管制电脑电信系统, 并进行了有关培训。

61. 欧洲和非洲支助中心已在奥地利维也纳的联合国国际药物管制规划署正式运作。

2. 项目的效果和影响

62. 人们日益认识到, 只有通过 NDS 这样的全球性举措一相对于区域或国家举措而言一才有可能实现获得并更新综合信息的目标。

63. 由于看到该项目奏效, 对药物管制电脑电信系统的兴趣及安装药物管制电脑电信系统的要求随之增加。

3. 遵循发展帐户标准的情况

64. 目前正在发展经营和维持药物管制电脑电信方面的国家能力, 将得益于私营部门(Oracle 公司)的一笔捐款。

98/99 E 在最不发达国家实施《生境议程》的能力建设和建立网络(联合国人类住区中心)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

65. 该项目的目标是, 加强发展中国的能力, 以便实施《生境议程》和《21 世纪议程》中与都市相关的部分, 并评价有关政策和作法的影响。将至少在 12 个国家利用城市观察站来加强城市基础设施信息。

66. 该项目属于中期计划方案 11(人类住区)的范围和优先事项。

预期成果和指标

67. 项目的执行将导致

(a) 接受援助的发展中国家内的主要群体获得与分析、交流和应用关于都市指标的数据和信息有关的更多的技能和知识;

(b) 根据参与国提供的关于主要群体在多大程度上获得与分析、交流和应用都市指标数据和信息有关的核心技术和知识的反馈意见来判断成绩。

B. 截至 2000 年底的进展情况

1. 产出

68. 通过在德里(5个国家)、加德满都、迪拜(10个国家)和科托努(5个国家)举办的活动,提高了人们对该项目的认识。

69. 将在 27 个国家的 82 个城市建立城市观察站。(目前在 263 个城市实施人居中心城市指标方案,其中许多最终可能加入能力建设方案。)

70. 监测《生境议程》的主要指标减少到了 23 个,对有关准则也进行了相应的修改。

71. 为每个区域能力建设方案分别编写了一套针对各自情况的教材。

72. 开发了可使各指标数据库综合起来的软件。

73. 来自三个区域能力建设机构的 15 名负责训练培训员的培训员参加了在新德里举办的为期一个月的方案。

74. 通过两次活动对技术人员进行了培训。一次是在印度,另一次是在塞内加尔。在另外 5 个非洲国家进行了与在塞内加尔进行的一样的培训活动。乌干达和厄瓜多尔的其他讲习班对当地技术人员进行了培训。

2. 项目的效果和影响

75. 在参与国,人们对《生境议程》的认识提高了。

76. 建立了一支受过训练的培训员和技术人员的队伍来继续推进该项目的目标。

77. 选定了 82 个城市作为与《生境议程》有关的能力建设活动的受益者。

3. 遵循发展帐户标准的情况

78. 在发展中国家的领导人和技术人员中发起能力建设活动,并利用已经拟定的材料规划更多的活动。

79. 对培训员进行训练是为了在提高认识和能力建设进程中产生乘数效应。

98/99 F 通过区域机构联机网络建立公共行政和财政方面的能力(联合国经济及社会事务部)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

80. 本项目的目标是协助发展中国家,通过区域和分区域中心交换公共行政和财政领域的知识、经验和做法,加强其机构和人力资源的能力。

81. 本项目属于中期计划方案 28(经济和社会事务)次级方案 28.8(公共行政、财政和发展)的范围和优先事项。

预期成绩和指标

82. 项目的实施将导致:

(a) 通过由经济部公共经济学和公共行政司引进的全球公共行政和财政联机网络(区域机构联机网络),加强发展中国家实施行政改革和现代化的能力;

(b) 加强发展中国家依靠自己的力量来处理公共行政和财政领域的问题;

(c) 实现这些目的,这将通过参与的机构的反馈,特别是关于网络如何促进具体有关目标的反馈意见来确定。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

83. 从对 87 个区域机构的调查中选定 8 个作为区域联机中心。2000 年对选定机构派出了需求评估团。

84. 1999 年 11 月举行的区域间协商会议通过了区域机构联机网络行动计划。第二次会议决定了区域机构联机网络的管理准则、使用其网站的议定书、伙伴关系正式化、调集资源、以及向 8 个选定区域联机中心提供针对各自情况的一揽子援助。

85. 硬件和软件业已购买和安装，正在由区域机构联机网络成员使用。特别注意当地是否具备维修和服务能力。

86. 正在编制培训材料，也在制订区域机构联机网络联机内容：其中一些已可供索取。

87. 7 个区域联机中心的工作人员业已接受关于区域机构联机网络联机管理系统的培训，并用该系统进行信息合并和管理。

88. 现已建立和示范一个区域机构联机网络网站。已于 2001 年 2 月向公众推介。

2. 项目的效果和影响

89. 会员国对区域机构联机网络倡议的初步反应说明它们给予强烈的正面支持。

90. 区域联机中心已开始意识到电子治理的重要性及它们在促进电子治理方面的作用。它们正在重组和加强其应付挑战的能力。

3. 遵循发展帐户标准的情况

91. 本项目的实施涉及大量南南合作。

92. 正在区域联机中心内进行能力建设。

93. 本项目正在与私营部门和世界银行开展协作。

98/99 G 发展政策分析研究网（联合国经济和社会事务部）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

94. 本项目的目标加强发展中国家研究机构进行发展政策分析的能力。

95. 本项目属于中期计划方案 28（经济和社会事务）次级方案 28.7（全球发展趋势、问题和政策）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

96. 本项目的执行将导致加强国家经济分析员和决策人利用国际认可的技术和框架来审查及预测其本国宏观经济表现的能力。

97. 将向研究人员和研究机构征求反馈意见，以确定他们学会和应用进一步的宏观经济分析技术以及受惠于同分区域、区域和全球网络的联系的程度。还将请会员国说明这种机构和网络在国家一级加强决策的程度。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

98. 本项目以非洲国家为目标。为加强南南合作，选定两所非洲大学（尼日利亚伊巴丹大学和南非比勒陀利亚大学）与经济社会事务部合作执行本项目。2000 年 12 月签订了合同。现已开始筹备活动，包括收集材料和数据、确定小组和制订训练纲要。

99. 设立了指导委员会来审查和核准国家小组的组成和所有活动。现已商定关于购置电脑硬件和软件的采购程序，并已制订一项六阶段工作计划。

100. 特别为非洲经济制订了一个样板模型，并考虑到低收入国家的一些特点，诸如结构改革和统计数据不足等。将把此模型提交 2001 年 4 月在比勒陀利亚大学进行的第一次训练方案。

2. 项目的效果和影响

101. 现在评价本项目的影响尚为时过早。

3. 遵循发帐户标准的情况

102. 在实施本项目时大力推动南南合作。

103. 本项目强调区域和分区域合作与协调。

98/99 H 执行《21 世纪议程》、《社会发展问题世界首脑会议哥本哈根宣言和行动纲领》和《第四次妇女问题世界会议北京宣言和行动纲要》的活动(联合国经济和社会事务部)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

104. 在这一标题下，核可了一个单一项目，其目标是协助提出要求的发展中国家加强能力，执行全球方案和行动纲领，特别是各联合国会议的后续行动。活动的重点将放在区域和分区域一级，特别着重加强区域和国家的统计系统在区域内的合作。

105. 促进执行《21 世纪议程》、《社会发展问题世界首脑会议哥本哈根宣言和行动纲领》和第四次妇女问题世界会议北京宣言和行动纲要》是中期计划，尤其是方案 28（经济和社会事务）下的优先事项。

106. 考虑到本项目的多样次级目标，将其划分为五个分项目，分别载述于下。

预期成绩和指标

107. 项目的实施将导致：

(a) 下面载述每个次级项目的预期成绩；

(b) 为了判断所有次级项目下取得的成绩，将了解以因特网为基础的电子联系的进展情况；获得决策所需良好信息的能力，包括加强国家基本统计资料的能力、在区域和全球两级更好地分享统计信息和提高自愿报告关于承诺的履行情况的能力。

1. 可持续发展

(a) 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

108. 《21 世纪议程》要求各国政府制订国家可持续发展战略，监测战略执行情况的方案、改进决策所需的信息、建立全国可持续发展委员会及促进民间社会

团体更多参与本次级项目的目标是为建立和加强国家能力。

109. 本次级项目属于中期计划次级方案 28.8（可持续发展）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

110. 本次级项目的执行将导致：加强国家和地方机制的能力去搜集、分析和应用知识、信息和专门技能编制国家可持续发展战略、决策、国家信息进程，以支持执行《21 世纪议程》第 8 章和第 40 章。

(b) 截至 2000 年底的进展

(一) 产出

111. 举行了两次关于可持续发展的区域协商会议：一次为非洲，于 1999 年 9 月在阿比让举行；另一次为拉丁美洲和加勒比，于 2000 年 1 月在圣地亚哥举行。

112. 重要的结论和建议概述于协商会议的报告，在这两个区域的区域会议上提供了预发本，以便利讨论可持续发展问题。这些报告正在定稿，以供出版。

113. 有关地区内的区域机构和分区域机构已就此主题改善了联网和合作。

114. 有关制订国家可持续发展战略的最好做法已予编目和出版。

115. 现已查明可从有关拟订国家可持续发展战略的援助中受惠的国家。

116. 正在推动加纳与肯尼亚之间进行机构间挂钩，以加强分区域在决策所需信息领域内的能力，以及加强用于监测和政策规划的信息管理系统。

117. 为每个国家分别编制了评估报告，后续行动预定于 2001 年初开始（政府官员的更换推迟了执行工作）。

118. 已经或将向毛里塔尼亚、尼日尔和苏丹提供关于拟订和执行可持续发展国家战略的咨询支助。

(二) 次级项目的效果和影响

119. 本次级项目已使非洲、拉丁美洲和加勒比区域决策者间提高意识，一些国家已开始建立响应《21 世纪议程》的能力。

(三) 遵循发展帐户标准的情况

120. 本次级项目特意使用来自积极进行本次级项目的区域的专门知识，并且正在促进联网和南南合作。

121. 重点放在建立和加强有关领域内国家能力上。

122. 正在促进与其他发展活动，诸如联合国区域经济委员会、区域开发银行和联合国其他实体的那些活动的协作。

2. 社会发展

(a) 核定次级项目概要

目标及同中期计划的关系

123. 社会发展问题世界首脑会议的《哥本哈根宣言和行动纲领》请各国政府进一步加强和（或）建立基础，广泛的全国和地方参与机制，以政府（包括地方政府）、非政府组织、公民、专业团体及私营部门的伙伴关系为基础，促进执行和后续行动。大会第二十四届特别会议之后扩大了执行范围，将诸如全球化、社会共同责任和发展筹资等问题包括在内。本分项目的目标是支助该进程。

124. 本次级项目属于中期计划次级方案 28.3（社会政策和发展）的范围和优先事项。

预期成绩

125. 本次级项目的实施将导致加强国家能力，编制设计、监测和评价方案和项目，以协助实现经大会第二十四届特别会议扩大的社会发展问题世界首脑会议的各项目标。

(b) 截至 2000 年底的进展

(一) 产出

126. 2000 年 12 月在危地马拉和俄罗斯联邦举行了两次分区域培训讲习班。

127. 危地马拉讲习班有来自八个国家的 31 名与会者，提供了下列方面的训练：社会发展问题首脑会议的承诺和大会第二十四届特别会议的协议；分区域检查承诺和政策的执行状况；尼加拉瓜对消灭贫穷政策和方案采取的后续行动；萨尔瓦多对制造就业机会采取的后续行动，危地马拉对社会融合政策采取的后续行动。与会者确认了下列两个具体步骤来促进在国家一级上执行这些承诺：

(a) 设立协调委员会；

(b) 创立一个分区域网络，以交换有关后续行动和执行工作的信息和经验。

128. 将以西班牙文分发一份详细的报告。

129. 莫斯科讲习班有来自独立国家联合体（独联体）国家的 30 名与会者。其主要目的是促进独联体内人力开发概念。

130. 2001 年上半年将印发一份关于独联体内人力开发情况的手册。

(二) 分项目的效果和影响

131. 来自这两个分区域的一批核心人士接受了与执行社会发展问题首脑会议有关问题的培训。

132. 在这两个分区域内，人们已认识到：必须响应社会发展问题首脑会议的承诺和协调这些响应。

(三) 遵循发展帐户标准的情况

133. 现已采取一项分区域办法，以因应以下挑战：如何响应在社会发展问题首脑会议上作的承诺和如何本着国家间协作精神推动积极联网工作。

134. 培训讲习班应确保在取得分项目的目的方面产生乘数效应。

135. 已设法与在此一领域内积极活动的其他机构，诸如独联体议会间大会和联合国其他实体等协作和协调。

3. 加勒比共同体的统计和指标

(a) 核定次级项目概要

目标及同中期计划的关系

136. 主要项目的目标之一是加强现有的南南网络和创造机会让专家了解统计领域迅猛的实质性的技术变革；提高国家机构编写有关统计资料的能力。这个分项目是在区域和分区域级别上进行的，由发展帐户资助的一系列统计能力建设活动的第一个，以满足加勒比共同体（加共体）国家的具体需要。

137. 本次级项目属于中期计划次级方案 28.5（统计）的范围和优先事项。

预期成绩

138. 本次级项目的实施将导致加强国家能力，进行基本统计发展，特别是在环境、社会和性别统计领域；以及在区域和全球级别上更好地分享统计资料。

(b) 截至 2000 年底的进展

(一) 产出

139. 向加共体 15 个成员国和加共体秘书处供应了电脑硬件和软件，以及参考书和载于光盘只读存储器的辅导材料，作为加强加共体成员国与其他国家之间联系的基础。在九个国家进行了实习培训和查找排除故障训练；其余国家将于 2001 年初从类似的支助获益。

140. 两个区域培训讲习班（一个关于环境统计，另一个关于社会和性别统计）提供了一份开列所需统计和指标的清单，一批核心工作人员已作好准备，着手在这些领域内开展工作。2001 年，将印发两份出版物，每份谈论一个主题，这构成本次级项目的一大产出。

(二) 分项目的效果和影响

141. 本次级项目尤其是各讲习班已导致在国家和区域两级上提出数项关于社会和环境统计的倡议。一些国家已就这些主题举办了国家讲习班。

142. 清楚查明了一些国家在统计能力上的弱点，以及有关的支助需求。

(二) 遵循发展帐户标准的情况

143. 正在加强国家和分区域能力。

144. 正在加强一个分区域网络。

145. 正在寻求与东部加勒比国家组织、美洲开发银行和联合国若干实体等其他实体在环境和社会/性别领域内的协作。

4. 《北京行动纲要》后续行动

(a) 核定分项目概要

目标及同中期计划的关系

146. 本次级项目的主要目标是加强提高妇女地位的有关国家机制，扩大妇女的参与，并且将性别分析纳入政策和方案之中。具体而言，努力把在北京所作的承诺充分纳入决策之中，并纳入决策所需的有关信息系统。

147. 本次级项目属于中期计划次级方案 28.2（性别问题和提高妇女地位）的范围和优先事项。

预期成绩

148. 本次级项目的实施将导致加强提高妇女地位的国家机构，并支持妇女加强在领导层和社会生活中的作用。这个次级项目又被分为两个次级项目：(a) 项目 A，妇女与贫穷，和项目 F，妇女与经济；(b) 项目 E，妇女与武装冲突。

(b) 截至 2000 年底的进展

(一) 产出

149. 现已完成对“减少贫穷的性别层面：微额供资政策的影响、过程和做法”的案头审查。

150. 现已完成一项关于“妇女与建设和平”的研究。这将作为关于加强妇女参与建设和平的区域协商（2001 年 4 月，亚的斯亚贝巴）的背景文件。

(二) 次级项目的效果和影响

151. 现在报告本次级项目的任何效果或影响尚为时过早。

(三) 遵循发展帐户标准的情况

5. 使用因特网进行人口研究

(a) 核定次级项目概要

目标及同中期计划的关系

152. 本次级项目旨在建立发展中国家在人口数据、统计和分析领域内的能力，以执行联合国各次会议的行动方案。

预期成绩

153. 本次级项目的实施将导致整个社区过渡到以信息和通讯新技术为基础的全球研究和通讯标准。这将避免南方研究界的边缘化、拉近在体制准备就绪和技艺上的差距、以及加强各研究中心参与发展过程的能力，特别是包括参与实施联合国重要会议的成果。

(b) 截至 2000 年底的进展

(一) 产出

西非法语国家的能力建设

154. 本项目于 1999 年 10 月在西非设立了法语人口研究中心网络，这是在布基纳法索举行的一次培训讲习班的成果。

155. 2000 年 4 月在尼日尔举行了第二次讲习班，主要由法国政府支助，这次讲习班导致为每个参与的人口中心设计一个网站，以及一些现已可供张贴的网页。

亚洲境内能力建设

156. 2000 年 12 月在曼谷亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）举行了一次培训讲习班，有来自该区域的八个中心参与。该讲习班审查了使因特网在亚洲各人口研究中心的存在体制化问题，并讨论了最佳做法。结果是推动了亚洲各人口研究和培训机构建立协作网络。作为这些活动的一部分，设计并建立了一个网站和电子讨论论坛。

非洲葡语国家的能力建设

157. 初步接触证实了需要提供支助，以克服数个目标非洲葡语国家重大的体制缺陷。如果困难和障

碍可予克服，设想在 2001 年底以前举行一次培训讲习班。

(二) 次级项目的效果和影响

158. 本次级项目已开始促进非洲和亚洲各人口研究中心间的联网，以及通过这些网站更广泛地散播信息。

(三) 遵循发展帐户标准的情况

159. 鼓励通过区域联网进行南南合作，这是本次级项目的设计的一个基本特点。

160. 为实施本次级项目，已设法与法语和葡语国家政府及加拿大蒙特利尔大学协作。

00/01A 亚洲及太平洋区域战略规划和自然资源的管理方面的能力建设(亚洲及太平洋经济社会委员会)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

161. 本项目的目标是加强亚洲及太平洋区域发展中国家在战略规划和自然资源的开发和环境保护的管理方面的能力。

162. 本项目属于中期计划方案 15（亚洲及太平洋区域经济和社会发展）次级方案 15.5（环境和自然资源的开发）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

163. 将加强关于环境保护和自然资源管理的现有专门知识网络以及设立新的网络。项目建议没有提供指标，但网络中有一批核心专家能够维持战略管理的进程，并协助国家利用这些网络，特别是制定国家行动方案。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

164. 通过将本项目并入区域方案和活动的办法加强网络。这些方案和活动是：(a) 经 2000 年 8 月 31

日至9月5日在日本举行的亚洲及太平洋环境与发展部长级会议通过的《2001-2005年无害环境和可持续发展区域行动纲领》和“展望21世纪”；(b) 2000年11月通过的《关于能源与可持续发展的亚太观点巴厘宣言》。促进能力建设是《纲领》和《宣言》的重要组成部分。

165. 根据选定的国别研究，本项目的第1阶段（2000-2001年）强调能源和水资源开发及环境保护。水部门战略规划准则正在拟订中，能源部门的类似准则较为复杂，适当协商服务一经确定，便将拟订类似准则。2001年将召开一个特设专家组会议，以审查准则草案。

2. 项目的效果和影响

166. 评定本项目的直接效果和影响为时尚早。

3. 遵循发展帐户标准的情况

167. 本项目强调区域内部各级别的能力建设。

168. 通过联合国不同实体（包括亚太经社会、粮农组织、环境规划署和教科文组织）之间的协作加强协同作用。

00/01 B 亚洲及太平洋区域戒毒和工作场所预防毒品培训方案(联合国国际药物管制规划署)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

169. 在区域一级建立机构框架和技术能力，以便进行关于戒毒和在工作场所预防毒品的培训。

170. 本项目属于中期计划方案13（国际药物管制）次级方案13.3（减少需求：防止和减少滥用药物）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

171. 在马来西亚国家药物研究中心建立能力，为本区域各国组织和举办关于戒毒和预防的培训班。

B. 截至2000年底的进展

1. 产出

172. 2001年1月项目管理小组在马来西亚槟榔 Sains 大学校园举行第1次会议。与会者包括药物管制署和劳工组织的代表、项目主任和为执行项目贡献力量有关大学系主任。已审查并通过2001-2003年期间的一项订正培训计划。

2. 项目的效果和影响

173. 本项目于2000年12月才开始推行，就项目的效果和影响提出报告为时尚早。

3. 遵循发展帐户标准的情况

174. 药物管制署与劳工组织之间的协作已经开始。劳工组织省免了13%正常方案支助费用。艾滋病方案也将参与本项目的执行。

00/01 C 改善水资源管理和加速水部门投资方面的能力建设(经济和社会事务部/各区域委员会/联合国大学/国际电信联盟)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

175. 本项目的目标是开发国家能力，以在发展中国家地方各级执行国家水资源战略。

176. 本项目属于中期计划方案28（经济和社会事务）次级方案28.4（可持续发展）的范围和优先事项：

预期成绩和指标

177. 通过本项目建立一个与水部门有关的国家、流域和地方机构的网络；加强五个国际河川流域组织之间的信息和经验交流；设立一个联合国水资源虚拟学习中心。

178. 本项目的建议没有列出指标。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

179. 本项目的实施涉及经社部、联合国大学、电信联盟和各区域委员会之间的协作。完成反映这些实体之间的分工情况的机构间协定耗费时间；由于未能达成正式协定，项目的实施已被推迟。已开始使用有关电脑软件和硬件设立虚拟学习中心。

2. 项目的效果和影响

180. 如上所述，评定本项目的效果和影响为时尚早。

3. 遵循发展帐户标准的情况

181. 2000 年 12 月核准的订正项目文件所设计的项目使联合国系统内的各实体之间产生适当协同作用。

00/01 D 可持续发展决策方面的能力建设（经济和社会事务部）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

182. 本项目的目标是为南南合作和小岛屿发展中国家拟订一个可持续发展框架，以帮助制订针对岛屿国家的经济和环境脆弱性的可持续战略。

183. 本项目属于中期计划方案 28（经济和社会事务）次级方案 28.5（统计）和 28.4（可持续发展）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

184. 项目的实施将导致巴巴多斯和马尔代夫利益攸关者组织之间建立和加强机构联系。在两国建立信息数据库和网址，以执行环境及社会-经济发展活动。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

185. 本项目将于 2001 年 3 月底开始有效地推行，执行实体（联合国/经社部/可持续发展司）向巴巴多斯派遣特派团。

2. 项目的效果和影响

186. 如上所述，本项目的实施尚未开始。

3. 遵循发展帐户标准的情况

187. 本项目利用双重机制促进南南合作。

00/01 E 促进非洲国家性别平等的能力建设机构（经济和社会事务部）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

188. 本方案的目标是加强非洲各国机构的能力，以确保提高妇女地位和将性别观点纳入主流；并加强妇女在公共部门中的决策能力。

189. 本项目属于中期计划方案 28（经济和社会事务）次级方案 28.8（公共行政、财政和发展）和次级方案 28.2（性别问题和提高妇女地位）的范围和优先事项：

预期成绩和指标

190. 按照《北京行动纲要》加强提高妇女地位的现有国家机构，并在三至五个国家设立新的机构。

191. 根据选定国家的国家机构参与代表提供的反馈意见评价这些成绩及其影响。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

192. 由于本项目很迟开办，迄今为止业务活动几乎没有执行。内部安排已经完成，包括设立了一个国家机构工作队。该工作队正在审查就国家机构地位、其面对的障碍及其后的需要进行的需求评价研究定稿。该项研究将作为 2001 年 4 月与国别代表举行的一次区域会议的一项重要投入。

2. 项目的效果和影响

193. 由于本项目很迟开办，预期尚未取得结果。

3. 遵循发展帐户标准的情况

194. 本项目考虑设立一个南南论坛和交流国家和国际经验，以及加强并如项目所述在这个领域建立国家能力。

00/01 F 合理和有效使用中亚的能源和水资源（欧洲经济委员会/亚洲及太平洋经济社会委员会）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

195. 合理和有效使用中亚的能源和水资源，以执行 1991 年《能源宪章条约》和 1994 年《关于能效和有关环境方面的能源宪章议定书》，所有这五个中亚国家都是签署国。

196. 本项目属于中期计划方案 16（亚洲及太平洋经济和社会发展）次级方案 15.5（环境和自然资源的开发方案）和方案 16（欧洲经济发展）、次级方案 16.1（环境）和 16.5（可持续能源）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

197. 本项目的实施将使国家决策人员和专家在合理和有效使用能源和水资源方面的技能有所提高，有关会员国参与合作性和谈判办法解决跨界资源问题的能力加强，减少对环境的压力和改善这个分区域的健康情况。

198. 将根据以下方面评估成绩：采用更切合实际的水和能源价格政策；会员国加入有关的区域公约、缔结公平分享水和能源的区域协定和承诺支助每个国家一个示范项目。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

199. 本项目与联合国中亚经济体特别方案密切相关。现有的特别方案合理和有效使用能源和水资源项目工作组充当发展帐户项目的指导委员会。

200. 项目协商会议于 2000 年 9 月在日内瓦举行，为改善主要国际利益攸关者之间在区域水问题上的联系沟通铺设道路。继这项活动之后举办了两个讲习班——一个关于水问题；另一个关于能源问题。两个讲习班于 2000 年 11 月在吉尔吉斯斯坦（比什凯克）同时进行。适当级别的人出席了两个讲习班。参加者

认为，如果有土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的专家参加，讲习班会更加有用。该项意见已反映到这两个国家的领导阶层。

201. 讲习班赞同编写两项研究报告——一项关于水问题，另一项关于能源问题，以供 2001 年 6 月在比什凯克举行的下一次联合讲习班参考。两项研究所涉时间很长。

202. 两个能源和水效率示范区获得支助。一个示范区在比什凯克，另一个在哈萨克斯坦阿拉木图。

2. 项目的效果和影响

203. 本项目成功地将五个中亚国家中的其中三个国家的专家和有关人员召集起来，更好地了解所涉问题及国际合作的可能性。

3. 遵循发展帐户标准的情况

204. 本项目极力强调以现代技术推行区域合作和交换信息及数据。

00/01 G 加强东南亚统计发展的区域能力（经济和社会事务部）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

205. 本项目的目的是建立一个东南亚统计资料交换网，这个网必须有能力响应该分区域的数据需要和支助统计方面的区域训练工作。预期这将导致在贫穷、非正式部门、国民帐户、环境和性别问题等领域的统计更标准化和可供比较。

206. 本项目属于中期计划方案 28（经济和社会事务部）次级方案 28.5（统计）的范围和优先事项

预期成绩和指标

207. 项目的实施将导致东南亚在特定统计领域建立足够的专门知识；共同的数据收集、分析和传播做法；加强编写关于主要经济和社会问题的分析报告的区域能力；以及提升本区域各国国家统计局之间的联系。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

208. 本项目的第一项实质性活动是 2000 年 9 月在马尼拉举行的环境经济会计国际讲习班。该讲习班训练与会者实施综合环境与经济会计制度。由于该讲习班，有人提议由关于“马尼拉工作网”题目的一群专家促进在分区域执行“绿色会计”。

209. 两个高级别国家特派团访问了东南亚国家联盟（东盟）的国家，作为评估统计组织、立法和管理的一部分，未来的训练活动将以特派团的发现为指导。

210. 有一个运作中的指导委员会，迄今已成功地查明该区域的主要需要。

2. 项目的效果和影响

211. 为时太早，看不出本项目的结果或影响。

3. 遵循发展帐户标准的情况

212. 本项目强调能力建设、南-南合作，并且利用涉及其他实体诸如联合国开发计划署（开发计划署），谋求协同作用。

00/01 H 能力建设和体制发展促进残疾人的机会平等（经济和社会事务部）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

213. 本项目的目标是加强能力，促进残疾人充分与有效地参与社会生活和发展的机会平等。

214. 这项努力的优先事项是出入便利，社会服务和社会安全网；以及就业和可持续的生计。

215. 本项目属于中期计划方案 28（经济和社会事务部）次级方案 28.3（社会政策和发展）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

216. 项目的实施将导致：

(a) 加强各国政府、非政府界和民间社会的知识、技能和能力，以促进从广泛的人权角度对待残疾人；

(b) 促进和发展残疾行动中心和机构网；

(c) 建立和发展可完全进入的关于人人享有平等机会的因特网信息服务，供有关国家使用。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

217. 《关于残疾人无障碍旅游问题巴里宣言》是亚太经社会举办的区域训练讲习班的成果的一部分，这个讲习班由本项目共同资助，于 2000 年 9 月举行。

218. 西亚经济社会委员会（西亚经社会）已展开一项创新方案，这是关于建立本国能力，促进进出文化场所和无障碍旅游的应用研究、分区域训练和实验行动。

2. 项目的效果和影响

219. 亚太经社会审议了《巴里宣言》和该讲习班的结果，预期将促进亚洲及太平洋残疾人十年的充分参与和平等的目标。

3. 遵循发展帐户标准的情况

220. 项目目的在建立和加强本国能力。最初，这是利用训练和实验行动进行的。已采取区域和分区域办法。

00/01 I 提高拉丁美洲和加勒比国家经济和社会发展政策能力（拉丁美洲和加勒比经济委员会）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

221. 本项目的目标是在经济和有关学科领域建立一个专家网，能够查明和处理本区域的问题、挑战和机会。

222. 本项目属于中期计划方案 17（拉丁美洲和加勒比经济和社会发展）次级 17.4（宏观经济平衡、投资和筹资）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

223. 项目的实施将导致:

(a) 将提高专业人员、决策者、政府官员和研究机构的分析和应用技巧,以支助在全国和地方各级拟订社会政策;

(b) 通过分享一般接受的经济政策文书,增加分区域、区域和区域间的经济合作;

(c) 分析从发给网络受益者的问卷定期收集到的回馈来评估成绩。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

224. 项目已初步查明可能参加网络的人,并将其初步重点缩小到在区域协调宏观经济政策及社会和贫穷问题。

225. 在一系列专家协商后,拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的执行秘书决定将 2001 年 1 月举行的第十三届金融政策区域讨论会的一个特别届会专门用于讨论宏观经济协调问题。预期一项具体结果将是创立三个小组部分,涵盖安第斯区、中美洲共同市场和南锥体共同市场。因此将把该网络插入与宏观协调有关的这些组织的经常活动中。

226. 关于该项目的第二个重点,即社会和贫穷问题,拉加经委会工作人员已积极地确保该项目同该区域其他有关活动、诸如拉丁美洲平等项目适当协调。他们也参与研究在该区域四周的贫穷和社会安全及住房问题。这将使拉加经委会能创立一个区域专家网及加强其关于贫穷问题的网址。

2. 预期效果和影响

227. 尚无法觉察出该项目的效果和影响。

3. 遵循发展帐户标准的情况

228. 本项目的主要重点是在加强经济及社会领域的区域合作与协调。南-南合作在项目的初步阶段已经明显。

00/01 J 制定西非综合环境评价和报告的合作框架(联合国环境规划署)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

229. 本项目的目标是加强国家和区域在环境数据和资料管理方面、包括分析和说明、提高协调和可比性的能力。

230. 本项目属于中期计划方案 10(环境)次级方案 10.2(政策发展和法律)和次级方案 10.5(区域合作和代表)的范围和优先事项。

预期成绩和指标

231. 项目的实施将导致:

(a) 现代信息技术支持提高环境的评估和报告;

(b) 更有力地支持环境分析、模拟示范、预报和职能分析;

(c) 以指数为主的模拟数据和电子的关于“环境状况报告”的报告,将列入联合国环境规划署(环境规划署)的全球环境展望报告系列之中。

B. 截至 2000 年底的进展

232. 本项目的实施截至 2000 年 12 月 31 日尚未开始。因此对产生产出和影响尚无任何进展;也无任何财务支出。

233. 已经同所有关键的国家 and 分区域机构举行详细的讨论,讨论它们在项目文件概述的活动方面各自的作用和责任。这项协商进程已完成,项目的实际实施将在 2001 年 1 月底开始。

00/01 K 非洲国家的可持续废物管理(联合国人类住区中心)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

234. 本项目的目标是加强非洲管理固体废物的能力,重点在尽量减少废物和非正式部门的微型企业。

235. 本项目属于中期计划方案 11（人类住区）次级方案 11.2（可持续的城市发展）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

236. 项目的实施将导致制订当地废物管理方案，包括尽量减少废物、回收、服务的私有化和发展将都市穷人创造收入与环境保护联系的微型企业的概念。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

237. 已选定三个城市从事项目实施：加纳的阿克拉、赞比亚的卢萨卡和肯尼亚的马林迪。已在阿克拉和马林迪开始评估废物管理需要和拟订示范项目的实施战略。此外，在使非正式部门参与项目之前，已在项目城市开始评估在社区一级可利用的能力。

2. 效果和影响

238. 由于项目在 2000 年 12 月才开始运作，因此还太早，无法觉察其效果或影响。

3. 遵循发展帐户标准的情况

239. 项目重点在能力建设和南-南合作与交流。

00/01 L 非洲城市地面和地下蓄水层的污染（联合国环境规划署/联合国教育、科学及文化组织/联合国人类住区中心/联合国大学）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

240. 项目的目标是避免以及尽量减少非洲都市地区的水污染，包括减少人民暴露于各种物质诸如病原体、致癌物质和硝酸盐的风险。

241. 本项目属于中期计划方案 10（环境）次级方案 10.1（自然资源的可持续管理和利用），方案 11（人

类住区）次级方案 11.2（可持续城市发展），以及方案 14（非洲的经济和社会发展）次级方案 14.2（加强粮食安全和可持续发展）的范围和优先事项。

242. 本项目由环境规划署和教科文组织的国际水文方案联合拟订。它将开发增值产品，以支助联合国国际伙伴关系基金（伙伴基金）联合国人类住区中心在非洲 7 个城市开展的“非洲城市供水”项目。

预期成绩和指标

243. 项目的实施将导致：

(a) 建立一个区域网，发展最适当监测非洲住宅区域地面和地下蓄水层的污染情况的方法，作为供水可能污染的早期警报制度；

(b) 加强绘制易受污染区地图的能力。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

244. 2000 年 12 月在马里巴马科展开本项目，为来自布基纳法索、科特迪瓦、几内亚、马里、毛里求斯、尼日尔和塞内加尔的法语与会者举行了一个为期四天的介绍性会议/讲习班。会议的成果是：

(a) 查明国家队和成立国家工作队；

(b) 商定数据库结构；

(c) 商定调查地区以及有关的资料系统；

(d) 未来 10 个月的工作计划；

(e) 商定评估地下水污染情况的参数和方法。

2. 项目的效果和影响

245. 现在还太早，无法看出效果或影响，因项目在 2000 年 12 月才开始。

3. 遵循发展帐户标准的情况

246. 项目的目的是在有关国家建立能力，以及促进南-南合作和区域与分区域的合作。

00/01 M 能力建设和政策衔接以促进资源主导型可持续发展(联合国贸易和发展会议/联合国大学)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

247. 通过面向政策的学术和发展方面的专门知识网,提高发展中国家、特别是那些依靠非再生或可耗尽自然资源的国家在设计 and 维持一个平衡和可行的长期发展道路方面的能力。

248. 本项目属于中期计划方案 9(贸易和发展)次级方案 9.3(商品与劳务方面的国际贸易和商品问题)的范围和优先事项。

预期成绩和指标

249. 项目的实施将导致:

- (a) 制订健全的资源主导型可持续发展政策;
- (b) 最好地利用各类从事资源工作的人员和其他利益相关者提供的投入和专门知识;
- (c) 通过南北和南南伙伴关系增加获得知识和最佳做法的机会;
- (d) 将根据下列衡量取得这些成果的情况:
 - (一) 有效利用本项目的产出,包括研究主导型培训单元和政策指导;
 - (二) 从发给网络成员和使用者关于获得的知识的问卷得到的反馈;
 - (三) 网址的建立和使用。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

250. 已重新设计一个关于自然资源的网址 (www.natural-resources.org/minera/s), 以便利合作性的计算和建立联系。

251. 已执行一组关于矿物和石油法和政策的远距离学习班的第一个单元,将在 2001 年初在因特网上发表。

252. 筹备工作集中在同世界各地超过 500 个人接洽,以期他们参加一个在进行中的政策研究网。已编制关于下列的两份讨论文件,并已发表在因特网:矿物主导型发展的能力建设以及关于建立联系和学习的信息和传播技术。

253. 已举办(2001 年 3 月,墨西哥)一个初步的讲习班。

2. 项目的效果和影响

254. 尚无法看出项目的效果和影响。

3. 遵循发展帐户标准的情况

255. 本项目利用同各区域委员会和其他区域机构密切工作,正在促进区域合作。它也正在同发展中国家的学术机构和其他机构合作。

00/01 N 加强发展中国家和转型国家有效地融入多边贸易体系的能力(联合国贸易和发展会议)

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

256. 本项目的目标是加强发展中国家和转型期经济国家官员的能力,以参与加入世界贸易组织(世贸组织)的进程并最大限度地利用多边贸易体系所创造的机会。

257. 本项目属中期计划方案 9(贸易和发展)次级方案 9.3(商品与劳务方面的国际贸易和商品问题)的范围和优先事项。

预期成绩和指标

258. 政府官员将:

- (a) 充分了解世贸组织的要求和机制,从而提高他们在加入过程中的谈判能力;
- (b) 向政府提供为确定其加入谈判以及编制货物和服务方面与加入有关的文件所需的资料和分析。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

259. 在加入国（五个最不发达国家，一个转型国家，一个发展中国家）共举办了七个关于加入世贸组织的讨论会和讲习班，大约 500 名官员、商业代表和学者参加了这些活动。目前已为导致加入世贸组织的一系列世贸组织大会具体会议组成谈判小组。

260. 七位来自世贸组织加入国的官员接受了贸发会议就关税、服务部门和农业等具体问题的培训。

261. 已为世贸组织加入国决策者制作了载有参考材料和分析的光盘。

262. 已招聘一批国际顾问从事部门分析并为诸多的世贸组织加入国政策提供关于农业补贴、环境卫生和植物检疫措施方面的政策建议。

2. 项目的效果和影响

263. 项目的一个直接效果是加入国得以更好地为各自的世贸组织工作队筹建谈判小组。政府更好地了解本国的权利和义务，并能更好地调整加入策略和战术。

3. 遵循发展帐户标准的情况

264. 本项目的主要目的是加强加入国官员在世贸组织谈判中维护本国利益的能力。这包括学习处于类似发展阶段的其他国家的经验。

00/01 0 债务可持续性分析方面的能力建设（联合国贸易和发展会议）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

265. 本项目旨在加强发展中国家（包括最不发达国家）以及转型期经济国家分析其债务情况的能力。

266. 本项目属中期计划方案 9（贸易和发展）次级方案 9.1（全球化和发展）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

267. 项目的实施将导致：

(a) 在发展中国家的债务问题办公室由受过培训的国民安装和有效使用一个专门软件工具——债务可持续性模型；

(b) 提高制订政策者对债务战略和制订宏观经济政策之间的联系的认识。

B. 截止 2000 年底的进展

1. 产出

268. 至 2000 年底，已有 31 个国家安装了债务可持续性模型。

269. 实施能力建设努力的培训课程已拟定完毕。课程包括二个方案：一个是讨论会方案，另一个是讲习班方案。

270. 在玻利维亚、萨尔瓦多和罗马尼亚组织了关于债务可持续模型的讲习班和培训。

2. 项目的效果和影响

271. 目前尚不可能确定该项目的效果和影响。

3. 遵循发展帐户标准的情况

272. 本项目主要强调建立分析债务的能力。

00/01 P 建设能力开展多样化和以初级商品为主导的发展（联合国贸易和发展会议）

A. 核定项目概要

目标及同中期计划的关系

273. 本项目旨在协助发展中国家国家企业部门适应自由化以后要求更高的贸易环境。

274. 修改政府政策以反映当今普遍采用的贸易框架。

275. 本项目属中期计划方案 9（贸易和发展）次级方案 9.3（商品与劳务方面的国际贸易和商品问题）的范围和优先事项。

预期成绩和指标

276. 项目的实施将导致：

(a) 增强政府的能力，以便为促进生产和贸易结构的横向、纵向和地理分布的多样化制定有针对性的、有效的和有顺序的政策；

(b) 提高企业使其商业战略和供应适应乌拉圭回合之后的贸易框架的能力；

(c) 加强商品部门和经济其他部门之间的联系。

B. 截至 2000 年底的进展

1. 产出

277. 迄今已有 25 个面向政策的研究报告和培训说明交付编写，内容包括政府和企业的出口多样化政策和战略。其中 11 项研究已作为背景和培训材料用于 2000 年 11 月在南非举行的“依赖矿物的国家的增长和多样化”讲习班。还为将于 2001 年在马里和肯尼亚举行的两个园艺讲习班准备了其他研究。2001 年后半年将在哥斯达黎加和泰国举行的关于粮食出口部门、商品出口多样化和减少贫穷讲习班将使用进一步的研究项目。目前正在着手准备这些讲习班。

2. 项目的效果和影响

278. 迄今举办的唯一一次讲习班已引发在采矿部门开展具体后继活动的要求。现在确定项目的影响还为时过早。

3. 遵循发展帐户标准的情况

279. 本项目着意找发展中国家的专家担任顾问。到目前为止已聘用的 25 人中，有 19 人来自发展中国家。

四. 改善进展报告

280. 对由执行实体递交的 23 份进展报告进行审查后发现存在以下若干报告不足之处：

(a) 着重活动而不是产出；

(b) 衡量进展的可量化资料或其他数据不足；

(c) 没有就拟议的新时间表提供足够的资料；

(d) 缺乏关于项目的机构环境以及发展帐户资金结束后项目可持续前景的资料；

(e) 没有明确说明协调安排；

(f) 没有充分遵守既定的进展报告指导方针。

1. 着重活动而不是产出

281. 进展报告往往阐述报告所述期间开展的活动，而不是阐述在实现预期成绩方面所取得的进展。例如，讲习班和培训活动是为了传授知识或更好地了解一个专题。产出是经过培训和有能力进行某一具体任务的人。几乎没有报告叙述在造就受训人员方面的进展，并提供关于所获取的技能/知识和人数的资料。

282. 项目执行到后期还须提供资料，说明产出得到运用的程度。受过培训的人员是从来某项新工作的先决条件，但仅有这个人还不够。要取得所需要的成绩，那个人必须要有合适的环境。受过培训的统计家只有能在有利环境下充分运用其知识才能为取得发展目标作出贡献。

2. 可量化资料不够

283. 一些进展报告列出参加讨论会或培训班的人数，但那些是例外。总的说来，报告提供的资料不足以判断许多活动的成本效益。为纠正这点并方便报告项目的影响，今后报告中必须提供多得已数量化的资料。不这样做就不可能评估项目的成绩及其影响。例如，若干项目提到它们的网站，但却没有提供有关所记录的点击次数的资料，以了解网站的使用和需求情况。

3. 交付时间表的变动

284. 一些项目的确提及并解释推迟开始的原因，但在大多数情况下却没有说明延误对下一年的工作计划有何影响，例如，说明如何调整工作计划，是追回失去的时间还是延长项目的时间。指导方针要求实事求是地估计每一项目的持续时间，但看来这一点并未得到遵守。

285. 曾建议每份年终报告应表明下一年的概算，接着提出当年已计算费用的工作计划。指导方针明确要求这点，但在许多情况下没有得到遵守。

4. 可持续性和机构环境

286. 大多数项目趋于建设能力。但对发展能力所在环境却少有评估或分析。一些项目确实提到能力薄弱或当地工作人员更替情况。但是，除非受过培训的人员和提供的设备处于有利的机构环境之中，项目成果的可持续性及其影响则将岌岌可危。

287. 今后的报告应酌情包括一节，说明正在发展的能力可持续的前景。

5. 没有明确说明与其他实体的协调

288. 若干项目不只一个执行实体。每一实体的作用和贡献以及为保证适当综合所有投入和防止重复所作的管理安排均应加以概要说明。

6. 需更好地遵守指导方针

289. 指导方针十分清楚明确地说明了目标、成绩、产出和活动之间的区别。在所审查的项目提案和报告中，在理解和使用这些术语方面常出现混淆情况。目前大力注重交付活动的做法必须改变，代之以对制造产出的关注，进而保证运用这些产出达到项目目标。

290. 指导方针提到需使用数量标准、数值或比率来表达结果。指导方针还提到需有指标衡量是否已取得预料的结果。在所审查的报告中很少有提供这类信息的，因而难以判断在实现目标方面的进展。

291. 指导方针大力提倡制定年度工作计划，但许多年终报告没有这类信息。在缺乏工作计划的情况下，很难有效地监督项目的实施。指导方针还敦促切实估计项目持续时间，一旦出现延误，则需予说明。有些项目持续时间低估了，而且并非所有项目均说明延误实施的理由。

五. 监督机构的建议

292. 2000年，内部监督事务厅（监督厅）审查了把过去三个经济和社会事务部门合并为经济和社会事务部的结果（A/55/750）。审查的一个重点是发展帐户及其管理和协调。监督厅认为发展帐户在预算外资源不增加或减少的情况下为开展咨询和技术合作提供了重要补充资源。关于这次审查的报告指出，行政和预算咨询委员会、方案协调委员会和大会第五委员会对项目提案进行严格审查，这对提案的重点和设计以及是否符合中期计划的优先事项产生了积极的影响。监督厅还注意到，经社部的协调职能包括为发展帐户提供实务、管理和行政支助。这一职能是利用经社部内部现有资源来行使的。鉴于该部目前资源有限和整个工作量在增加，还没有足够的能力来有效行使监测、评价发展帐户的项目并提出报告等重要职能。

293. 从2000年10月至12月，监督厅对发展帐户资助的项目实施情况进行了审计。审计的目的在于评估方案管理是否恰当以及方案的实施情况。审计建议方案主管人澄清低成本实施的要求，特别是为各个项目提出最高资金额，并建议进一步鼓励由经济和社会事务执行委员会若干实体联合实施项目，建议大会将此列入挑选标准。此外，监督厅建议在发展帐户资助的活动完成后，保持由发展帐户项目创立的合作框架。应将每一实体提供的方案支助计为效率收益并相应报告出来。项目提案（不论是否由发展帐户资助）须列出全部直接和间接成本。项目主管人协同经社执行委员会，应确保按照执行体的实际执行能力挑选和分配方案。最后，监督厅指出，应培训负责对发展帐户项目作实务报告的工作人员，以改进进展报告的质量和效用。

附件一

由发展帐户第一和第二档出资的项目名单

项目编号	经社执行委员会实体	标题	预算 (美元)
98/99 A	贸发会议	促进电子商务	1 980 000
98/99 B	非洲经委会	通过专门知识联网进行非洲经济和社会政策分析方面的能力建设	2 500 000
98/99 D	药物管制署	促进国际和国家药物管制的电脑和电信系统	1 100 000
98/99 E	人居中心	在最不发达国家实施生境议程的能力建设和建立网络	945 000
98/99 F	经社部	通过区域机构联机网络建立公共行政和财政方面的能力	1 525 000
98/99 G	经社部	发展政策分析研究网	1 325 000
98/99 H	经社部	执行《21 世纪议程》、《社会发展问题世界首脑会议哥本哈根宣言和行动纲领》和《北京宣言和行动纲要》的活动	3 570 000
00/01 A	亚太经社会	亚洲及太平洋区域战略规划和自然资源的管理方面的能力建设	738 000
00/01 B	药物管制署	亚洲及太平洋区域戒毒和工作场所预防毒品培训方案	549 000
00/01 C	经社部	改善水资源管理和加速水部门投资方面的能力建设	1 650 000
00/01 D	经社部	可持续发展决策方面的能力建设	300 000
00/01 E	经社部	促进非洲国家性别平等的能力建设	1 241 000
00/01 F	区域经委会/亚太经社会	合理和有效使用中亚的能源和水资源	1 750 000
00/01 G	经社部	加强统计发展的区域能力	1 500 000
00/01 H	经社部	能力建设和体制发展促进残疾人的机会平等	940 660
00/01 I	拉加经委会	提高拉丁美洲和加勒比国家经济和社会政策能力	325 440
00/01 J	环境规划署	制定西非综合环境评价和报告的合作框架	642 200
00/01 K	人居中心	非洲国家的可持续废物管理	500 000
00/01 L	环境规划署/教科文组织/生境/联合国大学	非洲城市地面和地下蓄水层的污染 (联合国教育、科学及文化组织/联合国人类住区中心)	250 000
00/01 M	贸发会议/联合国大学	能力建设和政策衔接以促进资源主导型可持续发展	498 000
00/01 N	贸发会议	加强发展中国家和转型期经济国家有效地加入多边贸易体系的能力	900 000
00/01 O	贸发会议	债务可持续性分析方面的能力建设	500 000
00/01 P	贸发会议	建设能力开展多样化和以初级商品为主导的发展	900 000

附件二

1998-1999 年两年期方案预算第 34 款(发展帐户) 出资的项目 (大会第 52/220 决议 A 和 B 号)

方案标题	执行办事处	核定	开支	1999 年 12 月	2001 年 3 月	项目总开支	2001 年 3 月	
			1998-1999 年	31 日结余	31 日止 2000-		31 日结余	
			2001 年开支					
(以千美元计)								
98/99 A	促进电子商务	贸发会议	1 980.0	305.1	1 674.9	1 347.8	1 652.9	327.1
98/99 B	通过专门知识联网进行非洲经济和社会政策分析方面的能力建设	非洲经委会	2 500.0	649.1	1 850.9	718.1	1 367.2	1 322.8
98/99 D	促进国际和国家药物管制的电脑和电信系统	药物管制署	1 100.0	300.2	799.8	198.2	498.4	601.6
98/99 E	在最不发达国家实施生境议程的能力建设和建立网络	人居中心	945.0	-	945.0	336.2	336.2	608.8
98/99 F	通过区域机构联机网络建立公共行政和财政方面的能力	经社部	1 525.0	103.5	1 421.5	541.4	644.9	880.1
98/99 G	发展政策分析研究网	经社部	1 325.0	-	1 325.0	1 241.2	1 241.2	83.8
98/99 H	执行《21 世纪议程》、《社会发展问题世界首脑会议哥本哈根宣言和行动纲领》和第四次妇女问题世界会议的《北京宣言和行动纲要》的活动	经社部	3 570.0	218.1	3 351.9	941.7	1 159.8	2 410.2
共计			12 945.0	1 576.0	11 369.0	5 324.6	6 900.6	6 044.4

附件三

2000-2001 两年期方案预算第 33 款（发展帐户）出资的项目 （A/C.5/54/37，大会第 54/249 号决议，第四部分）

		2001 年 3 月 31			
		日止 2000-2001		2001 年 3 月 31	
方案标题	执行办事处	核定	年开支	日结余	
		(以千美元计)			
00/01 A	亚洲及太平洋区域战略规划和自然资源的管理方面的能力建设	亚太经社会	738.0	12.3	725.7
00/01 B	亚洲及太平洋区域戒毒和工作场所预防毒品培训方案	药物管制署	549.7	-	549.7
00/01 C	改善水资源管理和加速水部门投资方面的能力建设	经社部	1 650.0	37.4	1 612.6
00/01 D	可持续发展决策方面的能力建设	经社部	300.0	-	300.0
00/01 E	促进非洲国家性别平等的能力建设	经社部	1 241.0	82.9	1 158.1
00/01 F	合理和有效使用中亚的能源和水资源	区域经委会/ 亚太经社会	1 750.0	424.3	1 325.7
00/01 G	加强统计发展的区域能力	经社部	1 500.0	180.8	1 319.2
00/01 H	能力建设和体制发展促进残疾人的机会平等	经社部	940.7	81.5	859.2
00/01 I	提高拉丁美洲和加勒比国家经济和社会发展政策能力	拉加经委会	325.4	38.6	286.8
00/01 J	制定西非综合环境评价和报告的合作框架	环境规划署	642.2	-	642.2
00/01 K	非洲国家的可持续废物管理	人居中心	500.0	1.7	498.3
00/01 L	非洲城市地面和地下蓄水层的污染	环境规划署/ 教科文组织/ 人居中心/ 联合国大学	250.0	81.4	168.6
00/01 M	能力建设和政策衔接以促进资源主导型可持续发展	贸发会议/ 联合国大学	498.0	113.4	384.6
00/01 N	加强发展中国家和转型期经济国家有效地加入多边贸易体系的能力	贸发会议	900.0	359.5	540.5
00/01 O	债务可持续性分析方面的能力建设	贸发会议	500.0	165.5	334.5
00/01 P	建设能力开展多样化和以初级商品为主导的发展	贸发会议	900.	404.1	495.9
共计			13 185.0	1 983.4	11 201.6
